

La Gestion de risques d'un projet



La gestion des risques, qu'est ce que c'est ?

- **Entreprendre un projet**

Entreprendre un projet, c'est **innover, avancer**. Cela implique donc de **prendre des risques**, de rencontrer des surprises, mauvaises pour la plupart.

Risque = Tout événement susceptible de se produire et de compromettre* la réussite du projet.

On peut identifier des risques techniques, de sécurité, de production, financiers, politiques, environnementaux, ..., mais aussi humains

Il faut **détecter, évaluer et gérer ces risques**, plutôt que de les **subir**.

La gestion des risques permet à une organisation de connaître et comprendre les risques auxquelles elle s'expose et de mettre en place un plan de gestion de ces risques

- **Remarque importante :**

- **Il faut** savoir prendre des risques **mais** les contrôler.

- **Il faut savoir « capitaliser » lorsqu'on subit un risque pour éviter que cela ne se reproduise.**

La Gestion de risques d'un projet


Quelques exemples de risques (conséquences défavorables) caractérisant les projets informatiques :

- L'augmentation des coûts;
- La réduction des bénéfices;
- L'accroissement des délais;
- La perte de qualité du logiciel;
- La réduction de la fonctionnalité;
- La perte d'information;
- La perte de satisfaction du client.
- L'intrusion de virus informatiques (risques informatiques)
- Etc

La Gestion de risques d'un projet

- Les risques sont inhérents à toute innovation
 - Corollaire
 - **Innovation = Nouveau**
 - **Nouveau = Incertitude**
 - **Incertitude = Risque**
- Alors Innovation = Risque**
- Il est donc nécessaire de prendre des risque dans un projet
- Gérer les risques consiste donc à gérer les incertitudes et à être proactif càd à les anticiper.

La Gestion de risques d'un projet

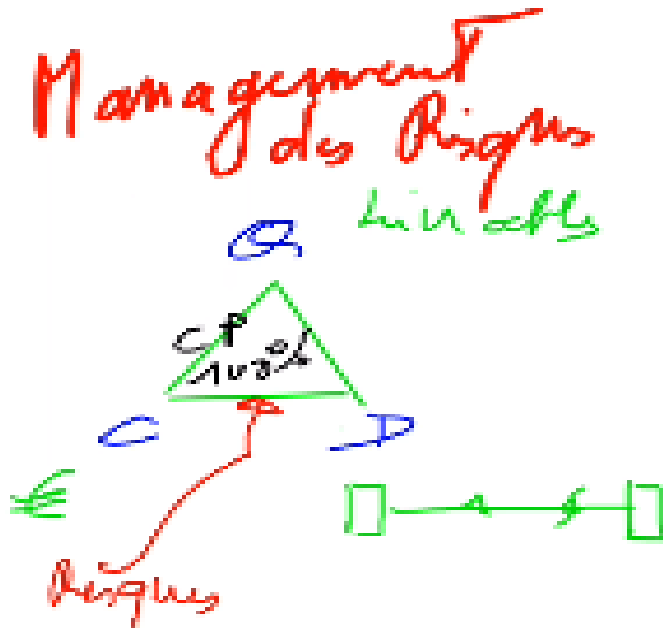

Le chef de projet est 100% responsable des objectifs du projet représentés ici par le triangle QCD

un perturbateur, ce sont les risques qui peuvent se produire et qui peuvent contrarier l'atteinte des objectifs

le chef de projet va devoir sécuriser son projet en créant un bouclier qui permettra soit d'éviter, soit d'atténuer, soit de transférer le risque. Le management des risques a comme objectifs de sécuriser l'atteinte des objectifs du projet

Un risque est un facteur externe à notre projet


Un risque peut changer
complètement notre planification

La Gestion de risques d'un projet

Chaque risque identifié doit être évalué. Quel est le principe de cette évaluation ?

Le principe de cette évaluation est **d'estimer l'impact du risque (ses conséquences)** sur **l'objectif du projet**. On distingue **trois types d'impact** :

- **impact coûts** (des dépenses supplémentaires devront être engagées).
- **impact délai** (le produit du projet sera livré avec du retard) et
- **impact contenu** (certains livrables devront être extraits du **périmètre** et/ou leur **performance** ne sera pas au niveau attendu).

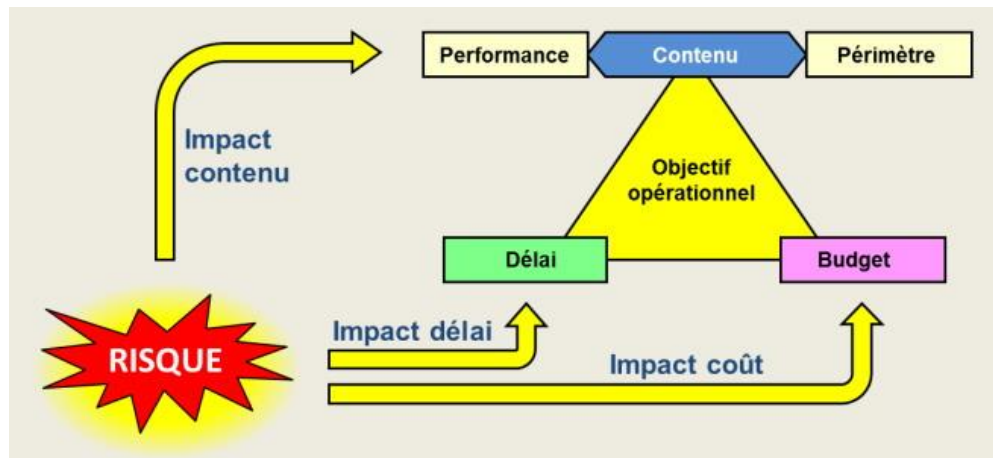

Qu'est ce qu'un risque ?

- D'une façon générale un risque est un **événement** **potentiel*****incertain** dont la réalisation **aurait des conséquences négatives** . D'une façon plus précise un risque c'est tout **événement** dont **l'apparition n'est pas certaine** et dont la **manifestation est susceptible d'affecter les objectifs du projet**.
- Il ne sera pas possible de tous les éliminer, le risque zéro n'existe pas.
- **حدث محتمل***

Qu'est ce qu'un risque ?

تعريف المخاطر



المخاطر هي أشياء يمكن أن تحدث أو لا تحدث في المستقبل ويمكن أن تؤثر على المشروع

المخاطر = معوقات عند حدوثها تؤدي إلى مشاكل

D'une façon générale un risque est un événement potentiel indésirable.
D'une façon plus précise un risque c'est tout événement dont l'apparition n'est pas certaine et dont la manifestation est susceptible d'affecter les objectifs du projet.

Qu'est ce qu'un risque ?

- Exemple
- Projet : Se rendre en voiture à une réunion
- Événement possible : Crevaision
- Cause : Un clou sur la route
- Conséquence : un retard ou une absence à la réunion

Qu'est ce qu'un risque ?

- **Exemple de quelques risques probables dans un projet**
- Les ressources humaines sont une source de risque pour le lancement d'un nouveau projet,
- **L'événement** : (Qu'est ce qui pourrait arriver ?) ?
- **Conséquences (l'Impact)**, ???

La gestion des risques, qu'est ce que c'est ?

Gestion des risques

=

Analyse proactive (التحليل استباقية) plutôt que réactive (التفاعلي) face aux dangers et aux problèmes potentiels qui peuvent en découler !

Capacité à réagir tant qu'on dispose encore d'une marge de manœuvre !!

- ANTICIPER, PREVENIR, GERER !!!!!
- MAITRISER LE FUTUR

La gestion des risques

- En gestion de projet, l'analyse des risques est une approche proactive qui vise à anticiper les évènements pouvant survenir de sorte à mieux se préparer ou à réduire les chances qu'ils se produisent

La gestion des risques, qu'est ce que c'est ?

المهام الرئيسية لإدارة المخاطر



- نشاط يهدف الى تحديد وقياس وتخفيض المخاطر المتوقعة
- السيطرة على الآثار السلبية والمخاطر الجديدة التي تحدث اثناء المشروع

Gestion de risques d'un projet

DÉMARCHE DE GESTION DES RISQUES

Etape 1 : Identifier les risques

Quelles sont les risques auxquels mon projet est exposé ?


Etape 2 : Evaluer les risques et les hiérarchiser

Gravité ; probabilité ; matrice de criticité

Etape 3 : répondre aux risques

Mise en place et suivi des actions définies

Gestion de risques d'un projet

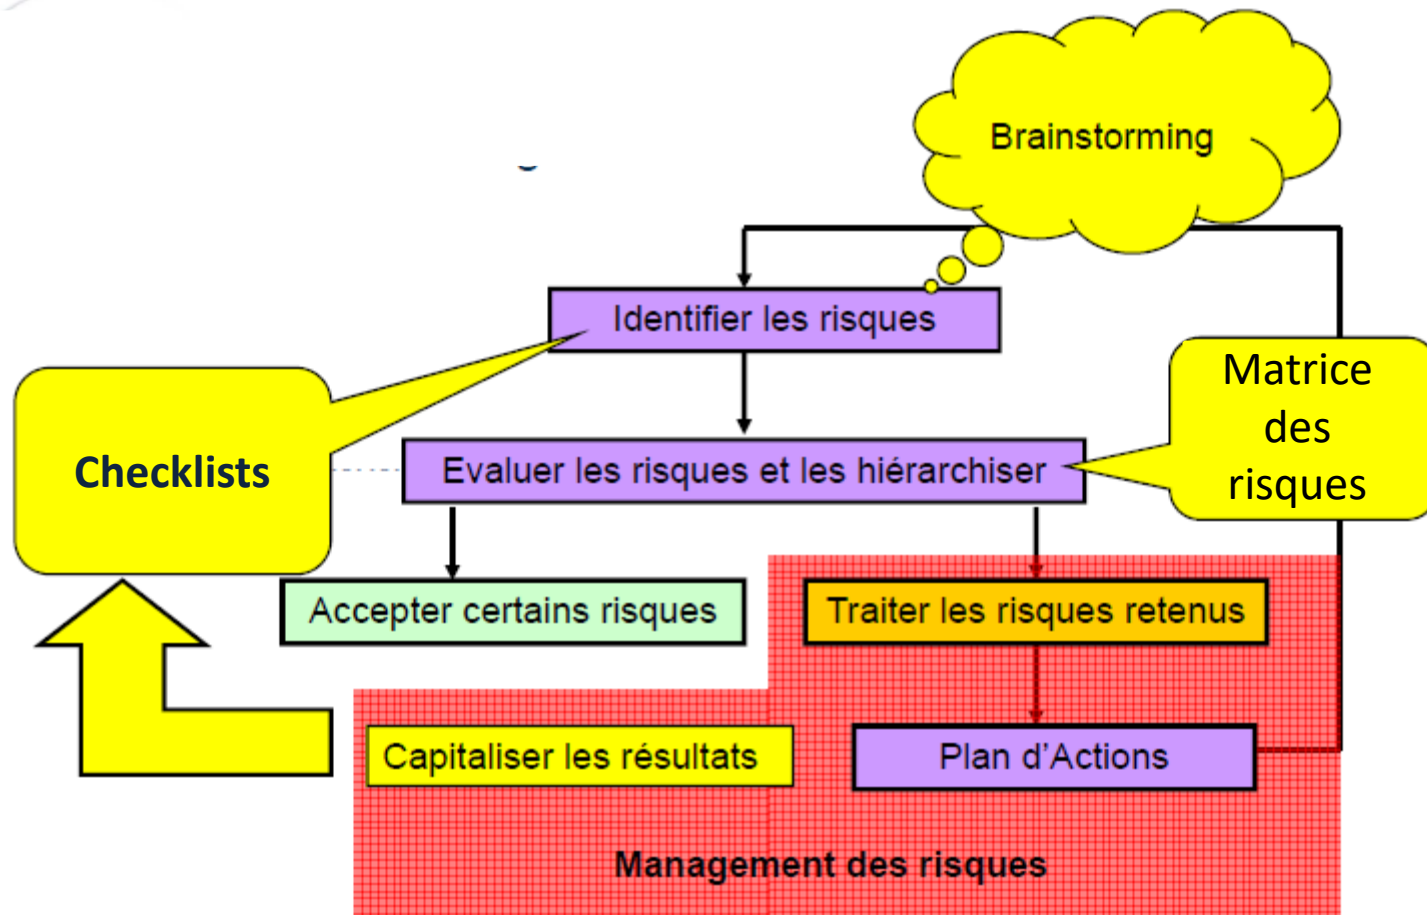

Le management de risques d'un projet

- **Etape 1/ Identifier les risques :**
- *Il faut se demander quels problèmes peuvent survenir ?*
- Consiste à répertorier, de manière la plus exhaustive possible, tous les événements générateurs de risques pour le projet et pouvant conduire à sa remise en cause ou au non respect de ses objectifs.

Le management de risques d'un projet

- **Etape 1/ Identifier les risques (suite):**
- Pour entreprendre ce recensement plusieurs techniques peuvent alors être utilisées puis combinées :
 - **l'analyse de la documentation existante et les outils de gestion de projet** déjà existants (PERT ou MPM , budget, arborescence des tâches, organigramme, dossiers... sont des guides pour identifier des sources de risques : chemin critique, jalonnement insuffisant, tâches sans responsable.....
 - **l'interview d'experts,**
 - **la réalisation de réunions de brainstorming** ((ou « remue-méninges » en français) est donc une façon de trouver rapidement des idées en groupe), ,
 - **l'utilisation de check-lists (résultant d'un REX de projets similaires)** ou de questionnaires préétablis et couvrant les différents domaines du projet.
- *Il en résulte alors une liste de risques possibles qu'il convient ensuite de classifier selon différentes typologies de causes possibles*

La gestion de risques d'un projet

- La typologie des risques permet de classer le risque pour mieux guider l'analyse. Un risque peut être catalogué généralement dans les catégories de risques suivants :
- **Remarque :** *Cette classification du risque apporte une vision globale qui facilite la mise en place de solution.*

Identification des risques

- **Quels sont les différents risques rencontrés lors d'un projet ?**
- Afin d'identifier les risques inhérents à un projet, il faut se poser la question « Quels sont les points faibles de mon projet » ? Globalement, il est possible d'identifier en grandes familles de risques :
 - Les risques propres à la gestion du projet
 - Les risques juridiques
 - Les risques concernant le respect du planning
 - Les risques humains
 - Les risques techniques
 - Risques Financières

Identification des risques

- **Quels sont les différents risques rencontrés lors d'un projet ?**
- **Les risques liés à la gestion de projet :**
- une mauvaise organisation
 - les rôles ne sont pas clairement identifiés, plusieurs personnes sont affectées à la même tâche,
 - implication insuffisante de l'équipe et/ou du client) ou encore
 - un mauvais choix de personne (un chef de projet inexpérimenté pour un projet important ou à risque par exemple).

Identification des risques

- **Quels sont les différents risques rencontrés lors d'un projet ?**
- **Les risques juridiques** : concernent tous les intervenants auxquels vous êtes liés contractuellement.
 - Un fournisseur qui n'est pas capable de tenir ses engagements en termes de livraison de matériel ou de logiciels ou d'un
 - cotraitant ou sous-traitant qui ne peut finalement pas fournir les ressources humaines convenues.
- **Les risques de non-respect du planning**
 - une mauvaise estimation de la durée d'exécution des tâches en amont.
 - Les dérapages sur le déroulement du planning peuvent d'ailleurs être liés à d'autres risques (techniques, humains...).

Identification des risques

- **Quels sont les différents risques rencontrés lors d'un projet ?**
- **Les risques humains : regroupent tout ce qui touche la gestion des ressources humaines du projet.**
 - maladies, voire les décès, de certains intervenants clés du projet,
 - la réaffectation de ressources à d'autres projets (et donc la diminution de la capacité de réalisation de l'équipe courante) ou encore
 - le manque de compétences de l'équipe nécessitant éventuellement des formations.

Identification des risques

- **Quels sont les différents risques rencontrés lors d'un projet ?**
- les risques techniques sont liés aux :
 - langages de programmation,
 - technologies et logiciels choisis pour le projet, mais qui ne sont pas encore maîtrisés par l'ensemble de l'équipe.
 - **une connaissance insuffisante du domaine concerné.** (Les risques concernent aussi bien la lenteur de réalisation des tâches que les erreurs en termes d'architecture pouvant être commises)

Les Risques Financières (budget) Erreur d'étude de marché, d'analyse de la concurrence...

- Sous estimation du budget
- Problèmes de trésorerie (recettes qui arrivent trop tard)
- Insatisfaction des actionnaires en cas de projet non rentable.
- ..

Identification des risques

- **Remarque importante** : Consulter les archives de projets similaires, qu'ils aient réussi ou échoué, peut constituer une source d'information précieuse sur les risques habituellement rencontrés. Vous pouvez aussi demander l'avis d'experts.

Gestion de risques

- **Etape 2 : Evaluer les risques et les hiérarchiser**
- **Evaluer et hiérarchiser les risques** c'est effectuer une analyse qualitative du risque
- Cette seconde étape consiste à **évaluer**, dans la mesure du possible, **la probabilité d'apparition de chaque risque recensé** et à **estimer la gravité de leurs conséquences directes et indirectes sur les objectifs du projet.**
- Une fois les risques **évalués**, il convient ensuite de **les hiérarchiser**, c'est-à-dire **fournir un ordre de grandeur permettant de distinguer les risques acceptables des risques non acceptables pour le projet.**
- Il en résulte alors une liste ordonnée et valorisée de risques associés au projet.

Gestion de risques

- **Evaluer et hiérarchiser les risques**
- Évaluer ou quantifier un risque consiste, pour chaque risque, à mesurer :
 - La probabilité d'occurrence et estimer cette probabilité ou proposer une échelle
 - La gravité des conséquences et les estimer ou proposer une échelle
 - Cotation de la criticité du risque

Matrice de criticité des risques

- **Matrice de criticité**

Méthode d'évaluation des risques et matrice Gravité/Probabilité

Une fois que les risques ont été identifiés, et que leurs gravités et leurs probabilités ont été évalués, leurs classes (ou niveau) de risque seront évaluées à l'aide d'une matrice Gravité/Probabilité.

L'évaluation des risques

- L'évaluation des risques doit toujours être le résultat d'un travail de groupe. Le principe repose sur l'estimation de deux caractéristiques du risque : sa fréquence et sa gravité, souvent évaluées sur une échelle de nombre entiers de 1 à 3 ou (comme ici) de 1 à 4.

Fréquence			
1	2	3	4
improbable 0 à 5%	Peu probable 5 à 20%	Probable 20 à 50%	Fortement probab. plus de 50%

		Gravité			
Type d'impact	Critère d'évaluation	1	2	3	4
Coût	Pourcentage du budget	insignifiant <1%	Faible <10%	Fort <25%	Très fort >25%
Délai	Nombre de semaines de retard	0 à 1sm	1 à 3sm	3 à 6sm	+ de 6sm
Périmètre et/ou performance	Impact sur le client	Ne détecte pas l'écart	Insatisfait mais accepte le produit	Menace de contentieux	Refuse la recette finale

Matrice de criticité des risques


- **Matrice de criticité**
- Les deux paramètres principaux de la criticité sont la probabilité d'apparition et la gravité. On donne en général quatre à cinq niveaux à chaque paramètres :
- **Fréquence**
 1. Très improbable.
 2. Improbable (rare).
 3. Probable (occasionnel).
 4. Très probable (fréquent).
- **Gravité**
 1. Faible.
 2. Moyenne.
 3. Grave.
 4. Très grave.
- Plutôt que de multiplier les deux valeurs, on construit une matrice et ce sont les zones de la matrice qui indiquent la criticité.

Matrice de criticité des risques

La matrice de sévérité ou criticité :

Le schéma ci-dessus représente une matrice de sévérité. Chaque risque sera représenté par un point sur le graphique, son indice de fréquence étant porté sur l'axe vertical et son indice de gravité sur l'axe horizontal (ou l'inverse, c'est sans importance).

La matrice de sévérité (1)

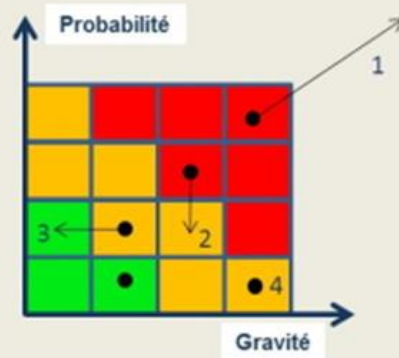

Risques inacceptables On doit supprimer ou réduire le risque
Risques tolérables sous contrôle On doit organiser la surveillance
Risques acceptables en l'état Aucune mesure à prendre (2)

Exemples d'actions de traitement :

- 1 Suppression du risque
- 2 Réduction de la probabilité et mise sous surveillance
- 3 Réduction de la gravité
- 4 Mise sous surveillance

(1) Ou matrice des risques ou matrice de criticité ou diagramme de Farmer

(2) Les risques acceptés seront couverts par la provision

Matrice de criticité des risques

Matrice de criticité des risques

Impact	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		probabilité			

Légende

Verte : réduction du risque non nécessaire

Jaune : surveiller les risques

rouge : réduction du risque nécessaire

La matrice des risques donne une vision graphique de la situation des risques dans le projet.

Matrice de risques

- Evaluation de la criticité du risque :
- L'indice de criticité d'un risque (C) est une fonction de sa fréquence (F) et de sa gravité (G). On convient généralement que $C = F \times G$. L'indice de criticité permet de hiérarchiser très facilement les risques. si l'on a choisi des échelles de 1 à 4 pour les indices de fréquence et de gravité, la criticité sera toujours une valeur entre 1 et 16.

Matrice de risques

- Comment faire le tri ?
- Définir des seuils de criticité
- Ex : sur une grille de criticité de 1 à 16
 - criticité < 4 (risque acceptable, il n'y a pas de traitement particulier)
 - criticité > 9 (risques inacceptables, mettre des actions de traitements)
 - $4 < \text{criticité} < 9$ (risques modérés à surveiller)

Remarque importante : Le coût de la maîtrise des risques ne doit jamais excéder l'impact attendu du risque

Matrice de criticité des risques

Zone Verte

Nous allons accepter ces risques
Il ne faut dépenser ni de l'argent ni du temps
de notre projet pour gérer ces risques

Matrice de criticité des risques

Zone jaune

Faire le suivi du risque
parce qu'il se peut que la probabilité ou l'impact change

Zone rouge: réduction du risque nécessaire

Gérer le risque

Calcul des risques

La mesure du risque

Le risque est classiquement évalué sous la forme d'une combinaison des facteurs de probabilité et de gravité.

$$\text{Risque} = \text{Probabilité} \times \text{Gravité}$$

Ces deux facteurs sont les piliers de la mesure du risque

Gravité : **c'est-à-dire la perte subie si le risque survient**

- Utilisation de probabilités élémentaires
 - ① Estimer la probabilité du risque
 - ② Estimer l'impact, le coût des conséquences
 - ③ Calculer le risque en multipliant ces deux valeurs
- Exemple : jeu à deux dés à six faces
 - L'obtention d'un 7 fait perdre 60 euros, quel est le risque ?

Calcul des risques

- Utilisation de probabilités élémentaires
 - ① Estimer la probabilité du risque
 - ② Estimer l'impact, le coût des conséquences
 - ③ Calculer le risque en multipliant ces deux valeurs
- Exemple : jeu à deux dés à six faces
 - L'obtention d'un 7 fait perdre 60 euros, quel est le risque ?
 - ① Il y a 6 façons d'obtenir un 7, soit une probabilité de $6/36 = 1/6$
 - ② L'impact est de 60 euros
 - ③ Le risque vaut donc $1/6 \times 60 = 10$ euros

Calcul des risques

- Probabilité du total T avec une paire de dés

T	Combinaisons	P(T)	En décimal
2	1+1	1/36	0,0277...
3	1+2, 2+1	2/36	0,0555...
4	1+3, 2+2, 3+1	3/36	0,0833...
5	1+4, 2+3, 3+2, 4+1	4/36	0,1111...
6	1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1	5/36	0,1388...
7	1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1	6/36	0,1666...
8	2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2	5/36	0,1388...
9	3+6, 4+5, 5+4, 6+3	4/36	0,1111...
10	4+6, 5+5, 6+4	3/36	0,0833...
11	6+5, 5+6	2/36	0,0555...
12	6+6	1/36	0,0277...

Je dispose de **2 dé à 6 faces**.

La probabilité d'obtenir : 7 est de 6 chances sur 36 ce qui fait 16.66%

Calcul des risques

- Les deux pièces
- **Dénombrement**
- Si on lance deux pièces de monnaie, quelle est la probabilité de tirer face au moins une fois?
 - Le nombre de cas total est 4, $E = pp; pf; fp; ff$
 - Le nombre de cas favorables est 3, événement "au moins une fois face": $A = ff; pf; fp$
 - Probabilité: $3/4$

Première pièce	face	face	pile	pile
Seconde pièce	face	pile	face	pile
Total = 3 fois face	1	1	1	0

Calcul des risques

- Les deux pièces
- Dénombrement
- Si on lance deux pièces de monnaie, quelle est la probabilité de tirer 2 fois face?
 - Le nombre de cas total est 4, E = pp; pf; fp; ff
 - Le nombre de cas favorables est 1, B = ff
 - Probabilité: $\frac{1}{4} = 0,25$

Première pièce	face	face	pile	pile
Seconde pièce	face	pile	face	pile
Total = 3 fois face	1	1	1	0

Calcul des risques

- Les deux pièces
- Dénombrement
- Si on lance deux pièces de monnaie, quelle est la probabilité de tirer 1 fois face?
 - Le nombre de cas total est 4,
 - Le nombre de cas favorables est 2,
 - Probabilité: $2/4 = 0,5$

Première pièce	face	face	pile	pile
Seconde pièce	face	pile	face	pile
Total = 3 fois face	1	1	1	0

Calcul des risques

Exemple:

Considérons un projet où une entreprise a 0.5% de chances de payer 100000 euros d'amende pour un défaut oublié calculer le montant du risque auquel l'entreprise est exposé

Calcul des risques

- **Exemple** : Une machine pourrait être défaillante si une opération de maintenance n'était pas réalisée dans les 6 prochains mois.
- La conséquence du risque s'il survient : La machine s'arrête, certaines pièces sont endommagées et à remplacer, la production est arrêtée pendant 48 h

On peut estimer la probabilité de défaillance dans les 6 prochains mois à 50% selon l'avis du responsable de la maintenance.

En cas de panne, l'impact serait les suivants :

- Réparation des pièces endommagées par la panne : 10.000 euros
- Pertes de revenus suite à l'arrêt de la machine et aux commandes non honorées : 50.000 euros
- Heures supplémentaires des agents de maintenance pour redémarrer la machine en urgence : 8.000 euros


On peut ainsi valoriser le montant du risque à $(10.000 + 50.000 + 8.000) \times 50\% = 34.000$ euros

Sachant que l'opération de maintenance à réaliser dans les 6 mois coûte 17.000 euros, quelle décision prenez-vous ?

ETAPE 3: REPONDRE AUX RISQUES

COMMENT CONTRER LES RISQUES ?

Les 5 stratégies permettant de contrôler le risque.

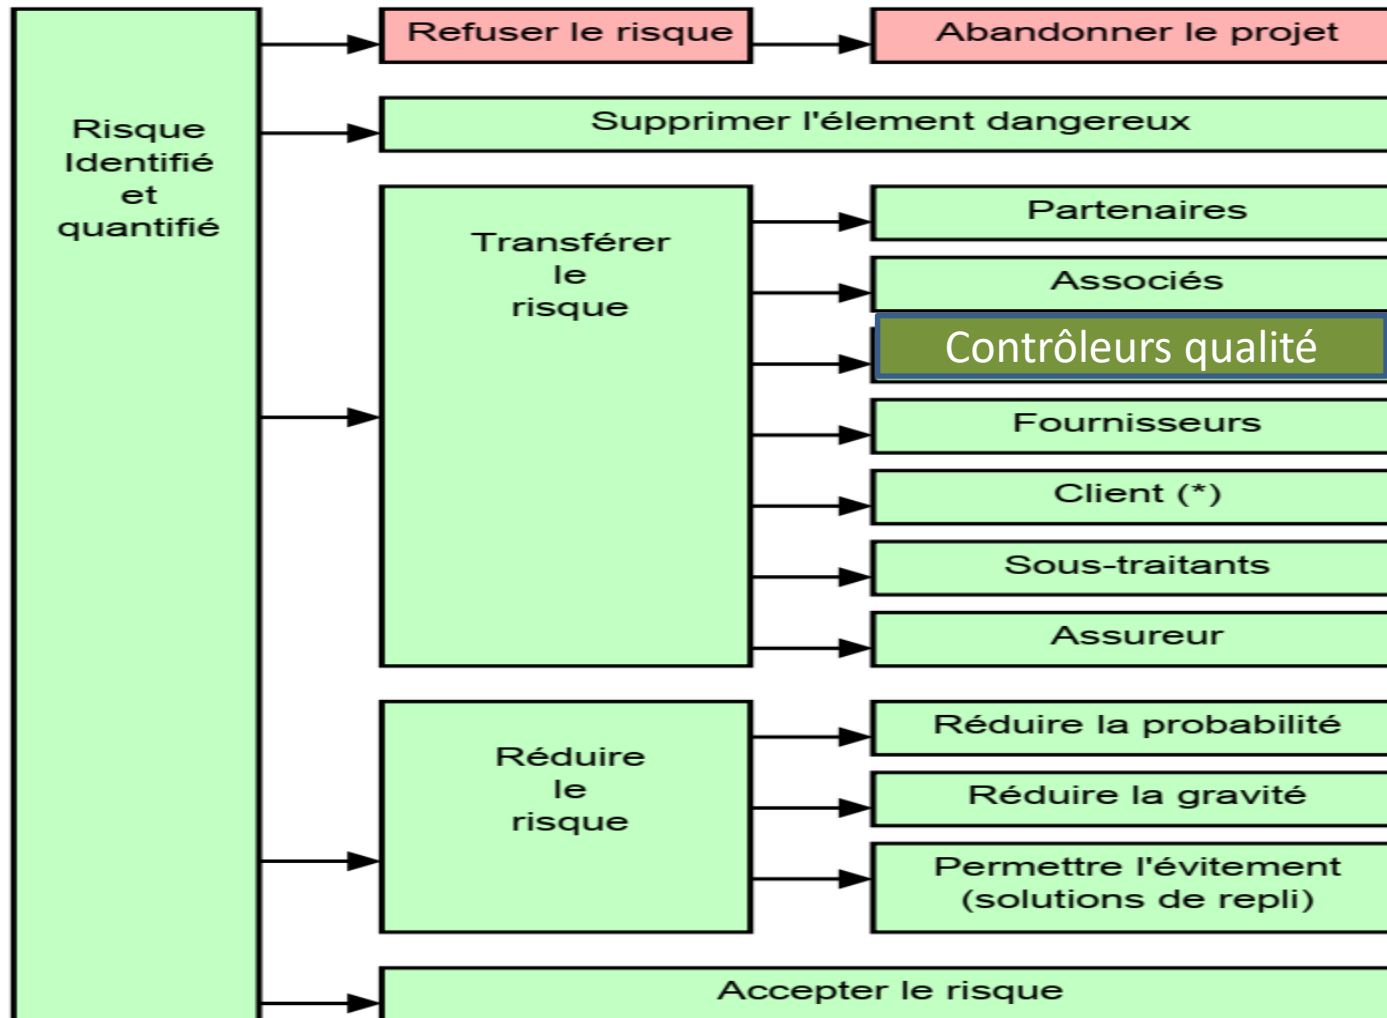

ETAPE 3: REPONDRE AUX RISQUES COMMENT CONTRER LES RISQUES ?

- ✓ **Refuser le risque :**
- ✓ **Supprimer le risque :**
- ✓ **Réduire le risque :** Il y a à priori trois façons de réduire un risque identifié :
 - **Diminuer la fréquence de ce risque.**
 - **Diminuer la gravité des conséquences.**
 - **Mettre en place des stratégies d'évitement.**
- ✓ **transférer le risque :**
- ✓ **Accepter le risque :**

ETAPE 3: REPONDRE AUX RISQUES

COMMENT CONTRER LES RISQUES ?

- ✓ **Refuser le risque** : La réponse la plus radicale est d'abandonner le projet. Solution qui doit être adoptée en dernier ressort, si aucune parade n'est possible
- ✓ **Supprimer le risque** : C'est le cas par exemple si l'on décide, dans un projet innovant, d'utiliser une technologie connue (peu risquée) au lieu d'une technologie émergente risquée
- ✓ **Réduire le risque** : Il y a à priori trois façons de réduire un risque identifié :
 - **Diminuer la fréquence de ce risque**. La prévention consiste à diminuer la probabilité d'occurrence du risque en diminuant ou supprimant certains des facteurs de risque
Exemple : une barrière empêchant l'accès, la connaissance et la conscience des dangers présents, la limitation de vitesse ...
de courant électrique, un hôpital s'équiperait d'un groupe électrogène à démarrage automatique. etc...
 - **Diminuer la gravité des conséquences**. La protection regroupe les mesures prises pour limiter les conséquences de la survenance d'un risque, en diminuant ainsi la gravité
limiter la gravité des conséquences (mesures de protection).
Ex : une ceinture de sécurité, un plan de secours...
 - **Mettre en place des stratégies d'évitement**. L'évitement du risque peut consister, par exemple, à l'éviter en refusant d'y être exposé. حل احتياطي.
faire en sorte que sa probabilité devienne nulle (ex: éviter un partenaire qui n'est pas considéré comme étant fiable). Avoir "sous la main" un sous-traitant ayant la compétence et la capacité pour se substituer au fournisseur défaillant.

ETAPE 3: REPONDRE AUX RISQUES COMMENT CONTRER LES RISQUES ?

- **transférer le risque** : le transfert de la gestion et des conséquences du risque à un tiers (se débarrasser d'un risque en le faisant prendre par un autre acteur) . Le transfert de risque comporte presque toujours le versement d'une indemnité à la partie assumant le risque.

Exemple : La qualité des livrables peut se révéler insuffisante, on fait procéder , en cours de fabrication, à des contrôles qualité par un organisme extérieur;

. Un autre cas classique est de faire appel à l'assurance (par exemple souscrire une assurance)

Accepter le risque : Acceptation – décision de ne pas modifier le plan de projet pour faire face au risque. le risque est accepté, aucune action n'est entreprise

Risque de faible priorité : Les accepter (lorsque le fait de gérer le risque implique un cout plus élevé que le risque lui-même matérialisé alors cela ne vaut pas la peine ce n'est pas un cout efficace, on va l'accepter tout simplement

Les 5 stratégies permettant de contrôler le risque.

	Dénomination	Exemple
1	Refuser le risque	abandonner le projet
2	Supprimer le risque	utiliser dans le cas d'un projet innovant une technologie connue (peu risquée) plutôt qu'une technologie émergente risquée
3	Réduire le risque	Il y a à priori trois façons de réduire un risque identifié
	• Diminuer la fréquence de ce risque	face au risque de coupure de réseau de courant électrique, un hôpital s'équipera d'un groupe électrogène à démarrage automatique. etc
	• Diminuer la gravité des conséquences	une ceinture de sécurité, un plan de secours...
	• Mettre en place des stratégies d'évitement	Avoir "sous la main" un sous-traitant ayant la compétence et la capacité pour se substituer au fournisseur défaillant.
4	Transférer le risque	Faire appel à l'assurance
5	Accepter le risque	Ne rien faire : aucune action n'est entreprise

ETAPE 3: REPONDRE AUX RISQUES COMMENT CONTRER LES RISQUES ?

Remarque importante concernant la réduction de risque


- Pour un risque identifié et évalué (localisé sur un repère gravité-fréquence):
- Diminuer le fréquence: c'est la prévention.
- Diminuer la gravité: c'est la protection.
- Le mieux étant de faire les 2 en même temps pour ramener le risque à une criticité acceptable

ETAPE 3: REpondre AUX RISQUES COMMENT CONTRER LES RISQUES ?

Remarque importante concernant la réduction de risque

A partir d'un risque identifié et évalué...

Pour lutter contre les risques, l'organisme met en œuvre des dispositifs de protection et/ou de prévention, qui constituent au final les éléments de maîtrise des risques

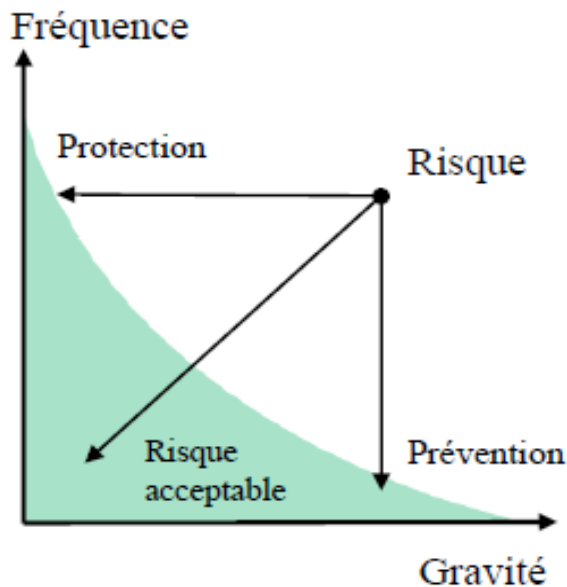

- > Réduire sa **gravité** : **Protection**
- > Réduire sa **fréquence** : **Prévention**

La protection diminue la gravité : en limitant ce que pourrait être l'impact du risque en cas d'accident

La prévention diminue la probabilité de l'accident, en mettant en place des mesures destinées à éviter que le risque ne survienne

... mieux : les deux à la fois...

Au final, protection et prévention constituent la maîtrise du risque

La Gestion de risques d'un projet

- **Suivi des risques :**
- **Son objectif est de mettre à jour la liste initiale des risques identifiés, de réévaluer leur criticité, de contrôler l'application des actions de maîtrise, d'apprécier l'efficacité des actions engagées, ...**

La Gestion de risques d'un projet

- **Suivi des risques**

- Mettre à jour le plan de suivi des risques
 - À intervalles réguliers
 - À chaque événement majeur pour le projet.
- Bâtir un tableau de suivi de risques : Un tableau de bord des risques est un outil permettant de piloter les risques pouvant impacter la mise en œuvre du projet concerné

La Gestion de risques d'un projet

Tableau de bord risques

Risques	O	G	C	Plan d'action	O'	G'	C'	
R ₁	4	4	16	Eviter Atténuer	2	1	2	
R ₂	3	4	12	Eviter Atténuer	1	2	2	
R ₃	2	1	2		2	1	2	
Indicateur d'Exposition Globale aux risques = I			I=30					I'=6

N. B Il s'agit de montrer sur un tableau de bord l'efficacité du plan d'action par rapport aux risques

Capitalisation sur la gestion des risques projet

- *Quelle trace doit - on laisser de la gestion de risque sur un projet ?*
- *Comment faire ?*
- *Réalisation d'une documentation spécifique et rigoureuse ((le Plan de Management des Risques du projet, le Dossier de Management des Risques du projet...)) sur les risques identifiés, les actions déclenchées, les résultats obtenus,*
- *un stockage fiable et facilement accessible des informations collectées*

N.B : *Cette capitalisation et cette documentation des risques doivent être effectuées de manière périodique afin de donner l'état global des risques encore encourus et d'apprécier l'état d'avancement des actions de maîtrise mises en œuvre.*

- La capitalisation de l'ensemble des expériences, des incidents et des solutions trouvées sera riche d'enseignements pour les projet ultérieures. الاستفادة من جميع التجارب

La gestion des risques

- **Conclusion**
- Le risque fait partie intégrante de la gestion de projet. Il est donc essentiel de mettre en place un plan de gestion des risques, et ce dès les premières étapes du lancement du projet. Cela permet d'identifier, de **prévenir et de limiter ces risques en anticipant leur traitement grâce à la mise en œuvre d'actions préventives et correctrices.**
- C'est une phase essentielle qui permettra de minimiser les pertes de temps et d'argent, et préparera à gérer efficacement le risque lorsqu'il surviendra.
