


L'organisation du projet et ses principaux acteurs



Les structures organisationnelles d'un projet

Les structures organisationnelles d'un projet

Introduction : Aujourd'hui, la plupart des entreprises construites selon un modèle plutôt pyramidal, centralisé et hiérarchisé tentent de faire évoluer leur structure et leurs pratiques managériales en introduisant des modalités plus ou moins abouties d'organisation et de management "par projet" comme : - la "Task Force" - L'organisation matricielle, - etc. ...

Les structures organisationnelles d'un projet

Introduction :

La structure pyramidale ou centralisée (le chef d'entreprise concentre tous les pouvoirs entre ses mains et il décide de tout) ;

La structure hiérarchique (le chef, à chaque niveau, est responsable de la gestion totale de son secteur devant son supérieur, qui à son tour est responsable devant son supérieur, et ainsi de suite) ;

Remarque : La structure pyramidale s'oppose au principe même du changement qui demande souplesse, réactivité et adaptabilité.

Les structures organisationnelles d'un projet

L'objectif de cette partie consiste à analyser :

- les différentes façons d'introduire des modalités organisationnelles et managériales "orientées projet " au sein d'une entreprise
- les avantages et les inconvénients d'une telle démarche pour les salariés et pour l'entreprise.

Les structures organisationnelles d'un projet

La réussite du projet suppose **la mise en place d'une organisation spécifique** pour **favoriser sa réalisation**.
En fonction de **la complexité du projet**, du **nombre d'acteurs** et de **parties prenantes**, certaines organisations seront à préférer à d'autres.

Mais attention, il n'y a pas de schéma idéal!!!!!!

Les structures organisationnelles d'un projet


- On désigne par **structure organisationnelle** la manière dont les tâches professionnelles sont organisées et coordonnées de manière à répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise tout en **maximisant son efficacité.**

Les structures organisationnelles d'un projet

Une structure organisationnelle indique


- Les **(tâches à réaliser)**,
- Leur **regroupement par unité** (direction, division, département, service),
- Et précise **le découpage hiérarchique** **التقسيم الهرمي**, et sera formalisé par une **représentation graphique** :
l'organigramme (c'est-à-dire les éléments essentiels de fonctionnement de l'entreprise).
- **En résumé** : Une structure organisationnelle décrit les rapports des différentes unités entre elles et les liaisons hiérarchiques

Exemple d'organigramme

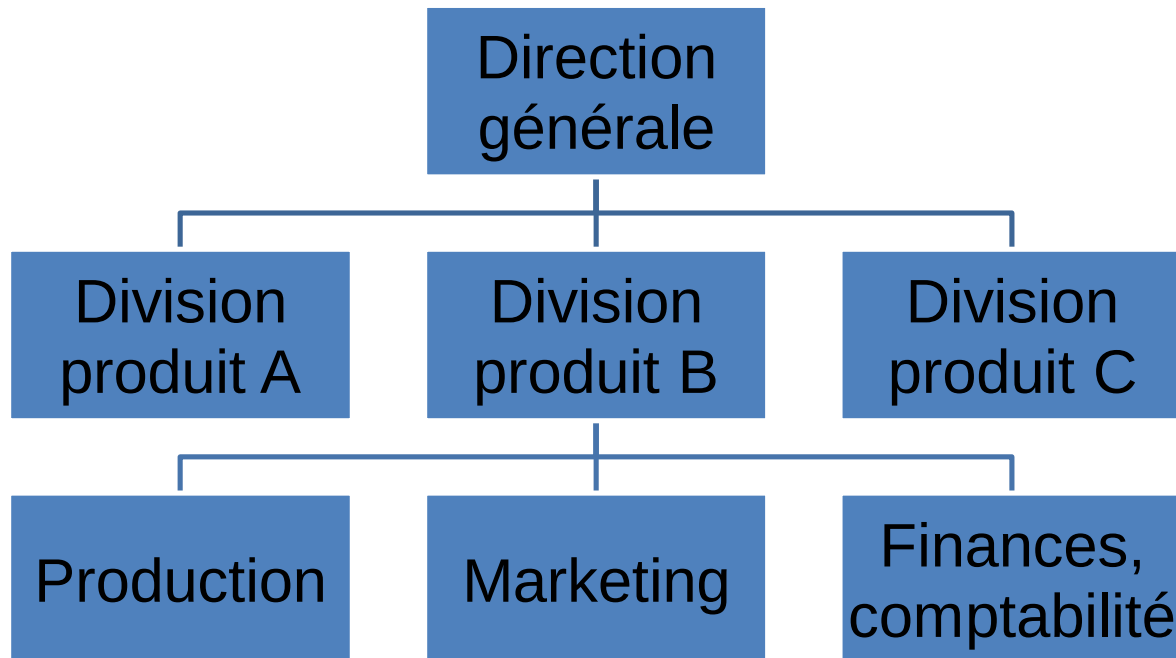


Explication : Nous avons ici pour une grande entreprise , une direction qui **coordonne le travail** de plusieurs divisions , sous **la hiérarchie** de la division produit B on va trouver des services de production , de Marketing et de Finances - comptabilité

Exemple d'organigramme

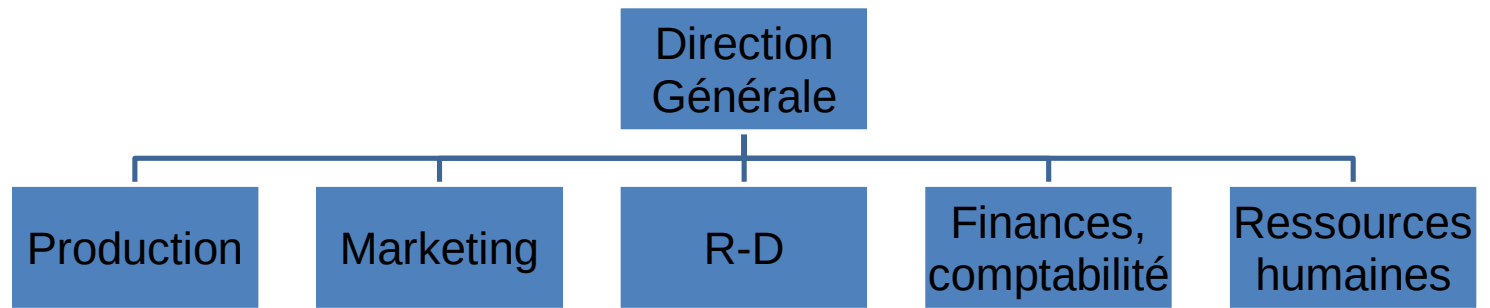

Exemple d'organigramme

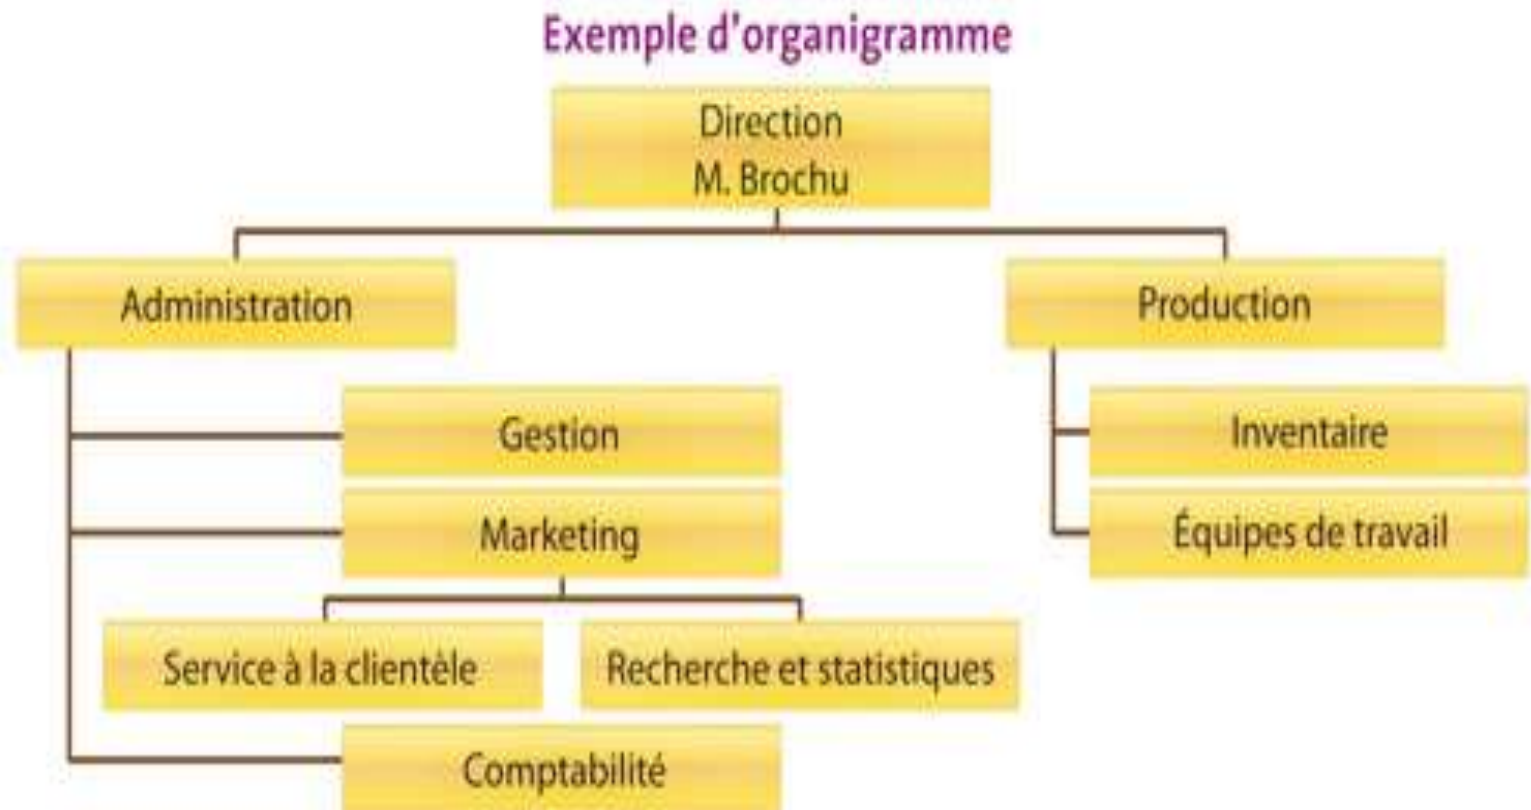

Les structures organisationnelles d'un projet

La plupart des projets se déroulent dans un **cadre organisationnel** إطار تنظيمي où ils coexistent avec d'autres projets ou d'autres activités à l'intérieur de l'entreprise.

Ces projets se trouvent fréquemment en concurrence pour :

- ❖ l'affectation des ressources
- ❖ l'exercice de l'autorité hiérarchique السلطة الهرمية .

Remarque : Les contraintes posées par une telle situation varient selon la structure que l'organisation ou l'entreprise s'est donnée.

Typologie des structures organisationnelles

Il existe plusieurs façons de présenter les organisations et nous retenons **une description traditionnelle** qui porte essentiellement sur les structures suivantes :

- ❖ **La structure fonctionnelle:**
- ❖ **La structure divisionnelle par projet :**
- ❖ **La structure matricielle :**
- ❖ **La structure « équipe dédiée » ou mode commando (Task force)**
:

Typologie des structures organisationnelles

La structure fonctionnelle:

Une structure fonctionnelle regroupe les ressources par domaine.
- Ses principales composantes sont des fonctions ou domaines de spécialisation appelées aussi des métiers (ressources humaines, achat, fabrications, études....)

Elles caractérisent les activités de l'entreprise et sont complémentaires entre elles.

- Les liens hiérarchiques sont clairs. Chaque groupe ou fonction ayant un responsable.


- La structure fonctionnelle fonctionne par silos* et correspond à une structure hiérarchique verticale.

- Leur coordination relève de la responsabilité de la direction.

La structure fonctionnelle est particulièrement adaptée à un environnement stable.

- *silos*Le fonctionnement en silos consiste à ce que chaque service travaille sur leurs spécialités sans se soucier des autres*


■ L'organisation traditionnelle

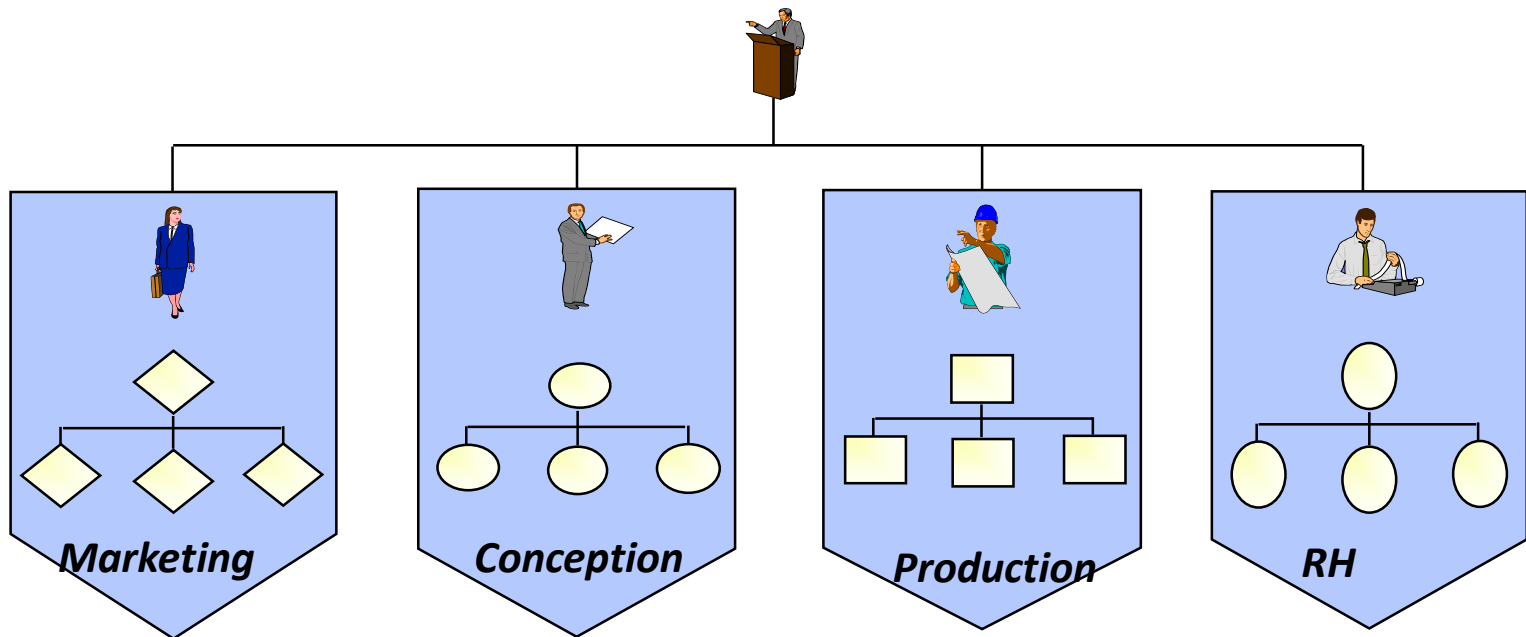

Explication : La structure fonctionnelle **rassemble des personnes qui exécutent des tâches similaires ou emploient les mêmes types de connaissances et de compétences au sein de groupes fonctionnelles.**

Exemple : sur la figure, nous voyons que toutes les personnes ayant des fonctions de ressources humaines au sein de l'organisation (par exemple, recrutement, formation et gestion des avantages sociaux) sont regroupées dans le groupe RH, qui est placé sous l'autorité du DG


■ L'organisation traditionnelle

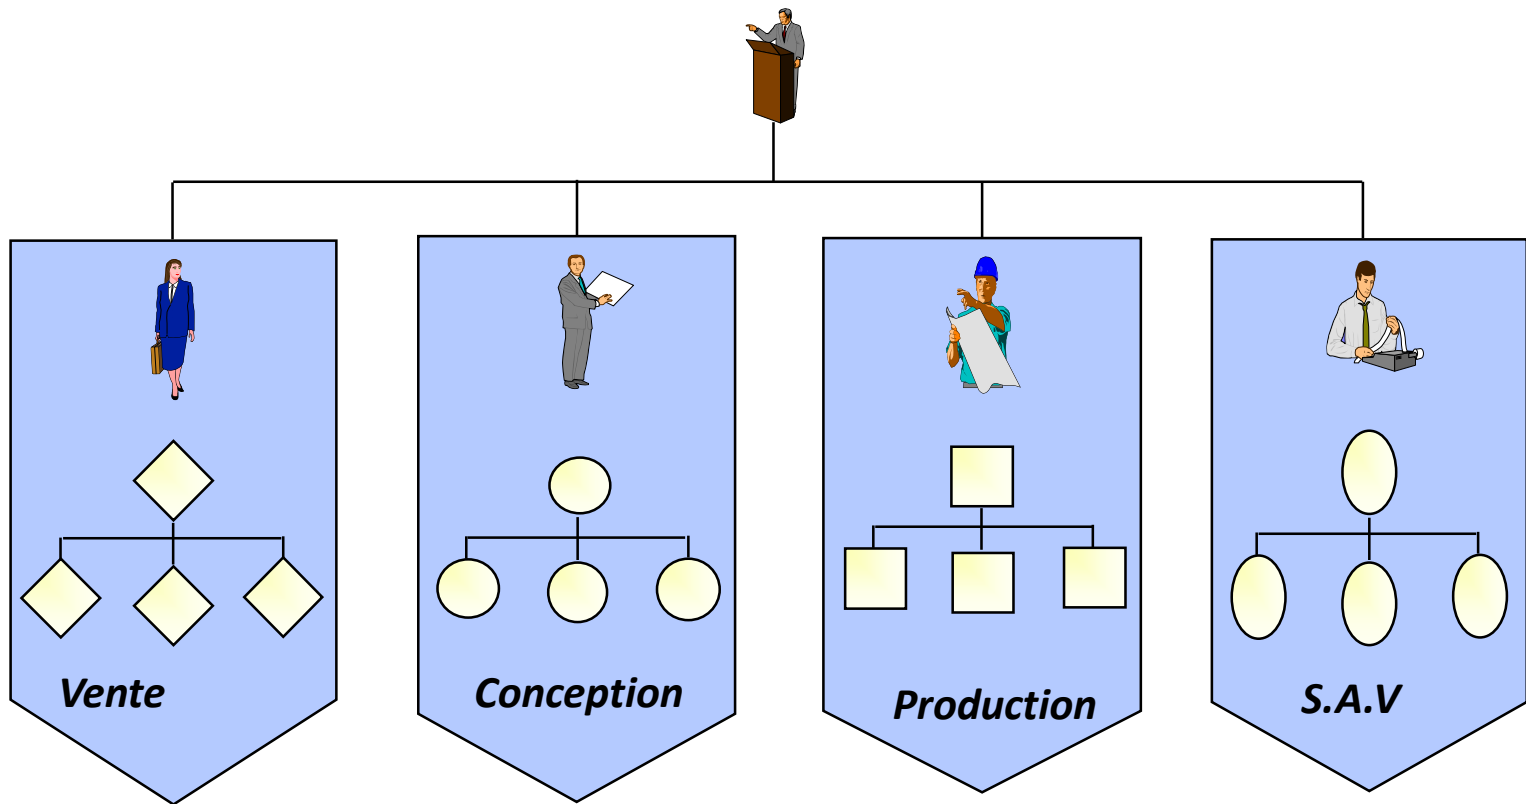

Maîtriser les métiers pour satisfaire aux objectifs techniques de l'Entreprise

■ L'organisation traditionnelle

Limites de l'organisation traditionnelle

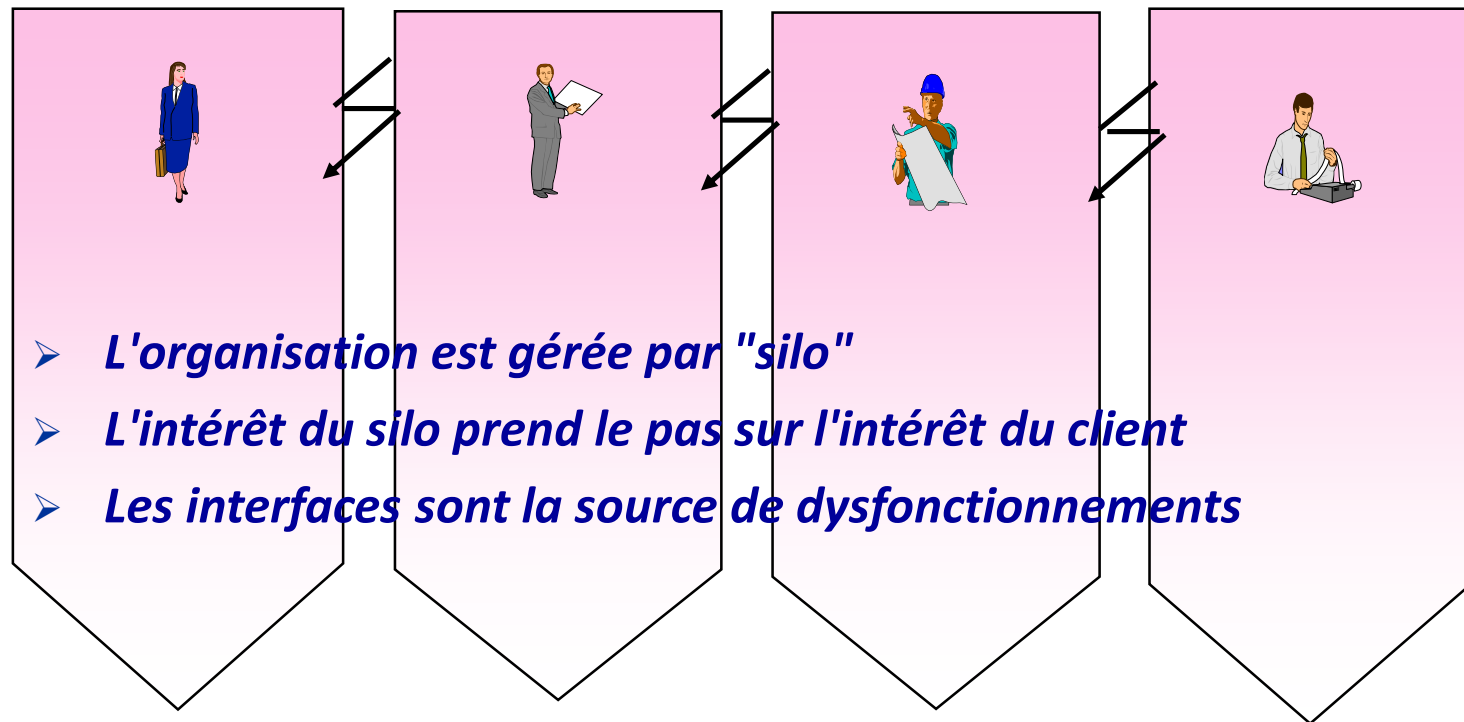

Typologie des structures organisationnelles

Comment s'organiser pour réaliser des projets dans une structure fonctionnelle ?


Typologie des structures organisationnelles

Comment s'organiser pour réaliser des projets dans une structure fonctionnelle ?

Lorsqu'une organisation ainsi structurée souhaite réaliser un projet, **le directeur nomme sur le projet des acteurs métiers**, donc des personnes qui travaillent avec lui dans son service sous ses ordres .


Le projet est mené successivement à travers les différents métiers

Chaque métier réalise ce qu'il a à faire puis le transfère à un autre métier.

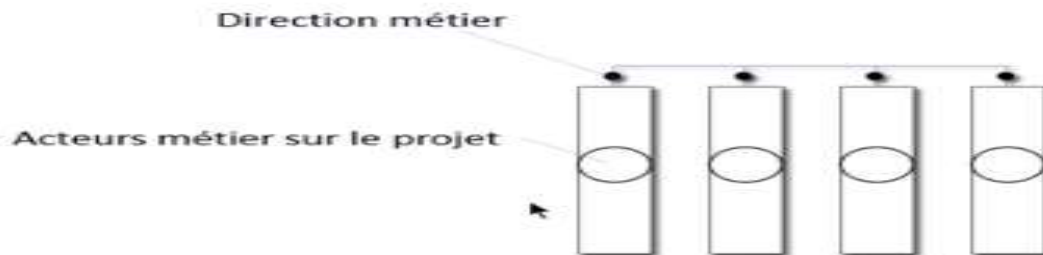

Projet au sein d'une structure fonctionnelle

Typologie des structures organisationnelles

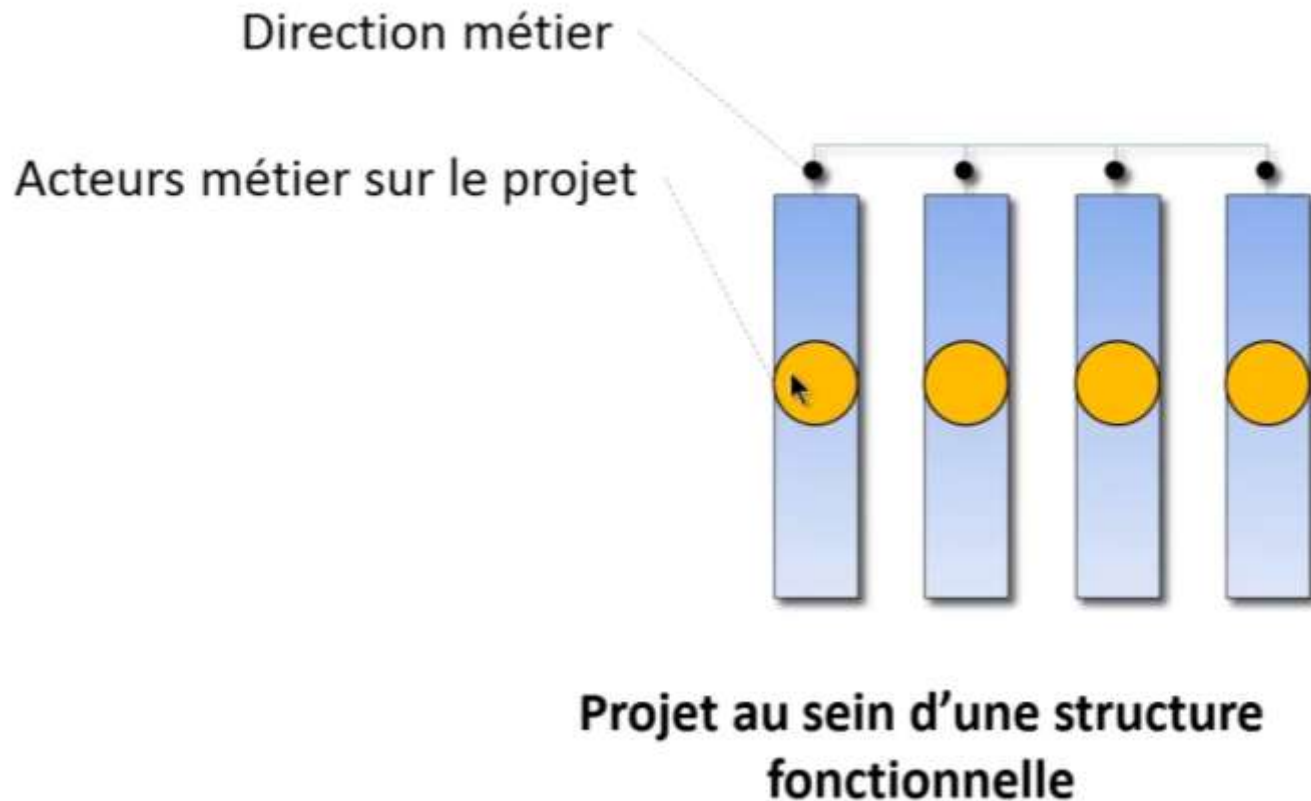


Typologie des structures organisationnelles

Projet au sein d'une structure fonctionnelle

Exemple : (mode de **développement séquentiel**) est un projet au sein d'une structure fonctionnelle

Procéder à la conception du véhicule ; puis à sa définition industrielle ; puis à son industrialisation et puis à sa qualification (La qualification consiste à vérifier la conformité des capacités de l'ouvrage aux spécifications techniques du maître d'ouvrage).

Typologie des structures organisationnelles

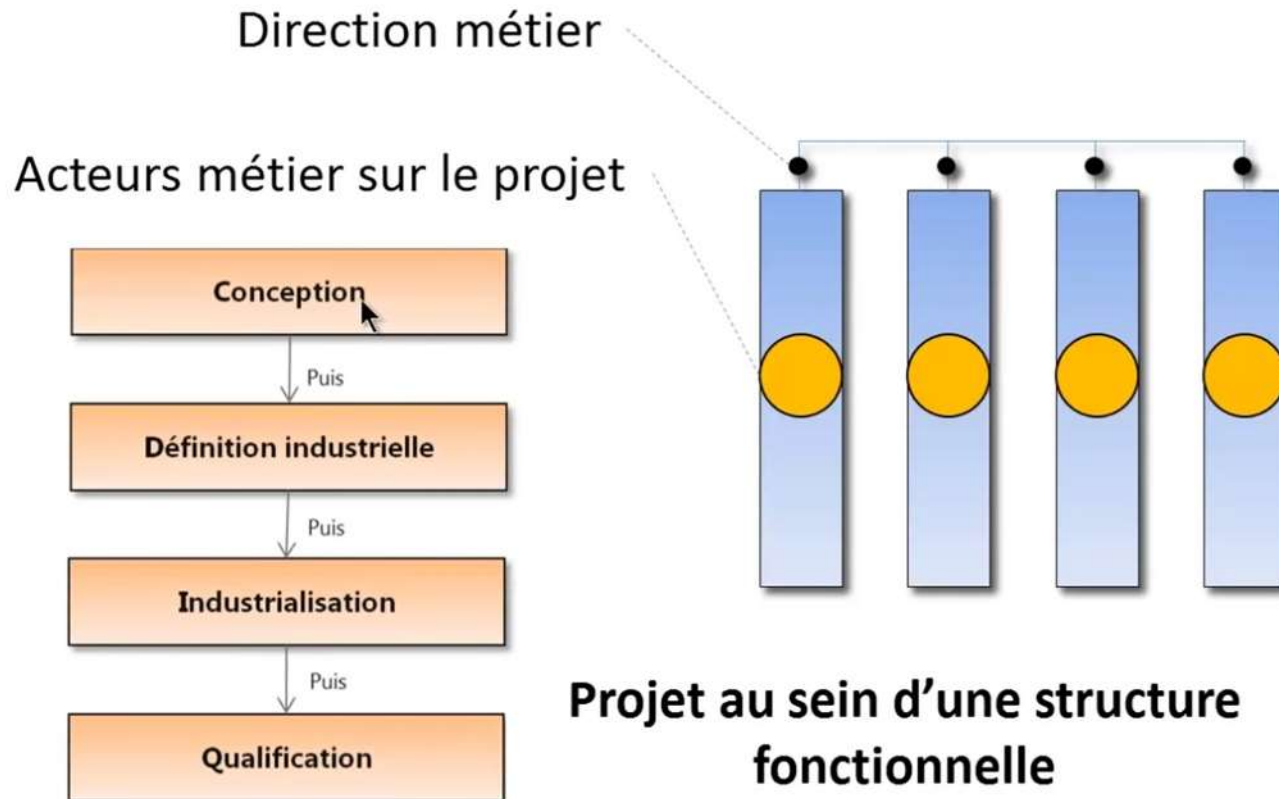


Typologie des structures organisationnelles

La structure fonctionnelle

Processus séquentiel

Chaque métier réalise ce qu'il a à faire puis transfère à un autre métier.

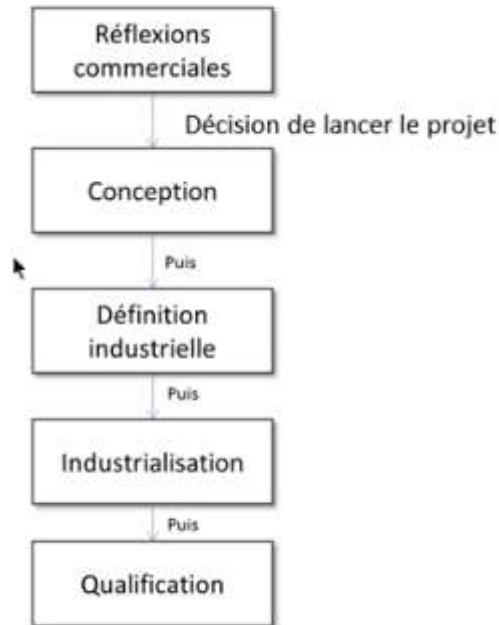

Typologie des structures organisationnelles

Comment s'organiser pour réaliser des projets dans une structure fonctionnelle ?

Structure très utilisée (Cette organisation est courante en entreprise) mais peu efficace sauf quand les lots de travail du projet peuvent vraiment être distincts et indépendants les uns des autres et pour les projets de taille réduite.

Il n'y a aucune coordination pour le projet.

Typologie des structures organisationnelles

Avantage et Inconvénients de la structure fonctionnelle

Avantages	Inconvénients
Les groupes fonctionnelles sont des réservoirs de compétences et connaissances dans leur domaine d'expertise	Structure centralisé
- Communication montante et descendante facilitée .	- Pas ou peu de communication transversale
- Les groupes fonctionnelles fournissent des personnes habituées à évoluer dans un environnement de travail bien ciblé et solidaire	- Cloisonnement entre les services - Faible capacité d'adaptation à des changements
Répartition claire des rôles et des fonctions des chefs de services	- Aucune personne neutre pour diriger les projets pluridisciplinaires

Typologie des structures organisationnelles

- **La structure divisionnelle par projet**

- Elle permet **d'organiser l'entreprise par divisions**.
- Elle est **découpée par projets**. (Par exemple, les sociétés de consultants, les organisateurs d'événements, les entrepreneurs généraux dans le domaine de la construction,)


A la tête de chaque projet, il y a un chef de projet dirigeant une équipe qui lui est rattachée

- L'ensemble des chefs de projet est coordonné par la direction de l'entreprise

Remarque : A chaque division, sont attribués les moyens nécessaires (moyens humains et matériels) pour assurer son autonomie , ce qui rend notamment ce type de structure coûteuse.

Typologie des structures organisationnelles

- La structure divisionnelle par projet

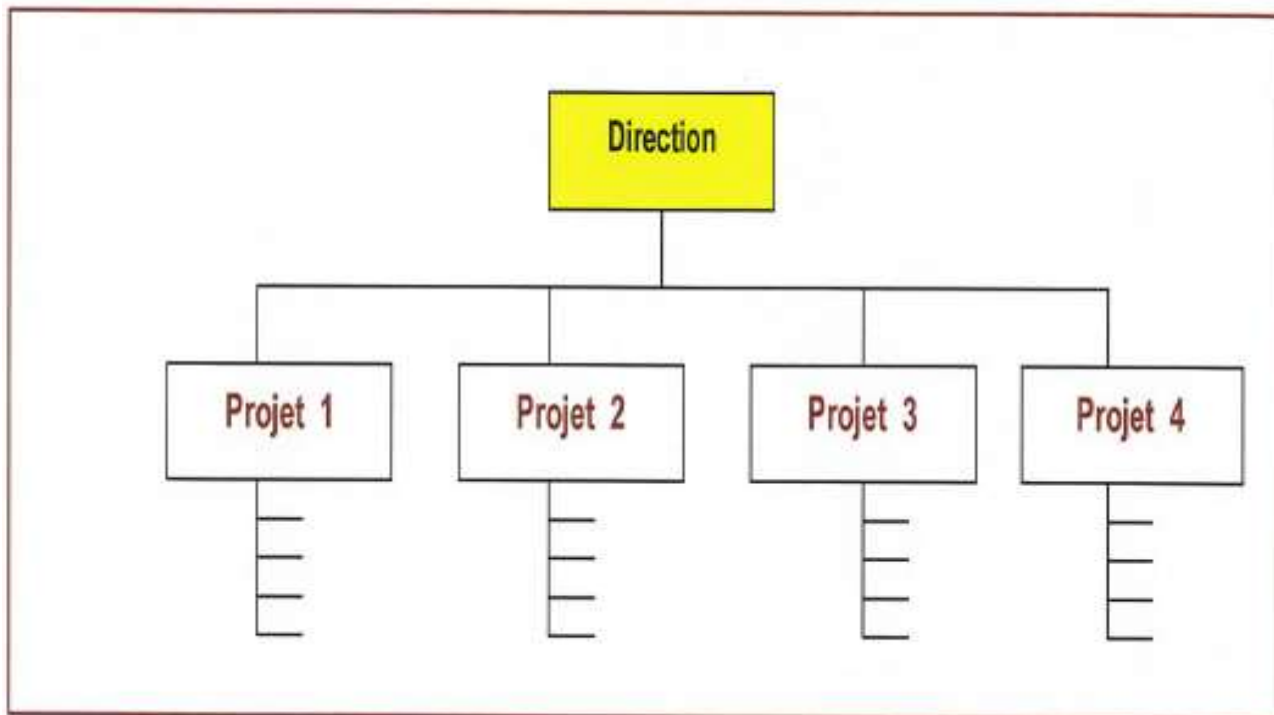

La coordination des divisions est assurée par le siège de l'entreprise

Typologie des structures organisationnelles

- **La structure divisionnelle par projet**

Quel est le principal inconvénient ?

le principal inconvénient est la sous-utilisation des ressources.

- Les ressources ne sont pas toujours utilisées à leur maximum.
- Le degré d'utilisation d'une ressource spécialisée tend en effet à varier suivant le stade d'évolution du projet.

Remarque 1, il n'est pas toujours facile de se départir d'une ressource pour quelques jours, sachant que l'on devra la réemployer à plus ou moins brève échéance.

Remarque 2 : Ce type de structure crée parfois un double emploi inefficace des ressources, étant donné que, par souci d'autonomie, chaque projet cherche à se doter de ressources humaines et matérielles et d'outils de gestion qui lui sont propres.

Avantage et Inconvénients de la structure divisionnelle par projet

Avantages	Inconvénients
- Grande autonomie des chefs de projet	- Pérennité de l'entreprise liée à la durée des projets
- Forte implication du groupe dans le projet	- Pas ou peu de communication transversale
- Structure adaptable au marché	- Cloisonnement entre les projets
	- sous-utilisation des ressources
la flexibilité stratégique : des changements peuvent être effectués au sein de chaque division sans bouleverser ni déstabiliser l'ensemble de la structure de l'entreprise (suppression ou de création de divisions selon la stratégie globale de la direction générale).	risque de conflits entre les différentes divisions pour l'obtention de ressources

Typologie des structures organisationnelles

-**La structure matricielle** : L'organisation *matricielle* est définie par ses **fonctions ou métiers verticales** et ses **projets horizontaux**. Elle utilise *simultanément* les caractéristiques de la structure fonctionnelle (axe métier) et celle de la structure divisionnelle (axe projet), *tout en évitant leurs inconvénients*.

Remarque : Cet arrangement permet aux composantes fonctionnelles de maintenir leur existence propre et de poursuivre, s'il y a lieu, leurs activités courantes tout en fournissant les ressources spécialisées nécessaires à la réalisation des projets


Principe de fonctionnement :

- **Le détachement**, pour la durée du projet, d'effectifs appartenant à la structure fonctionnelle **vers la structure divisionnelle**.
- **Le retour des effectifs**, en fin de projet, de l'axe projet vers l'axe métier

Typologie des structures organisationnelles

- La structure matricielle

- La structure matricielle

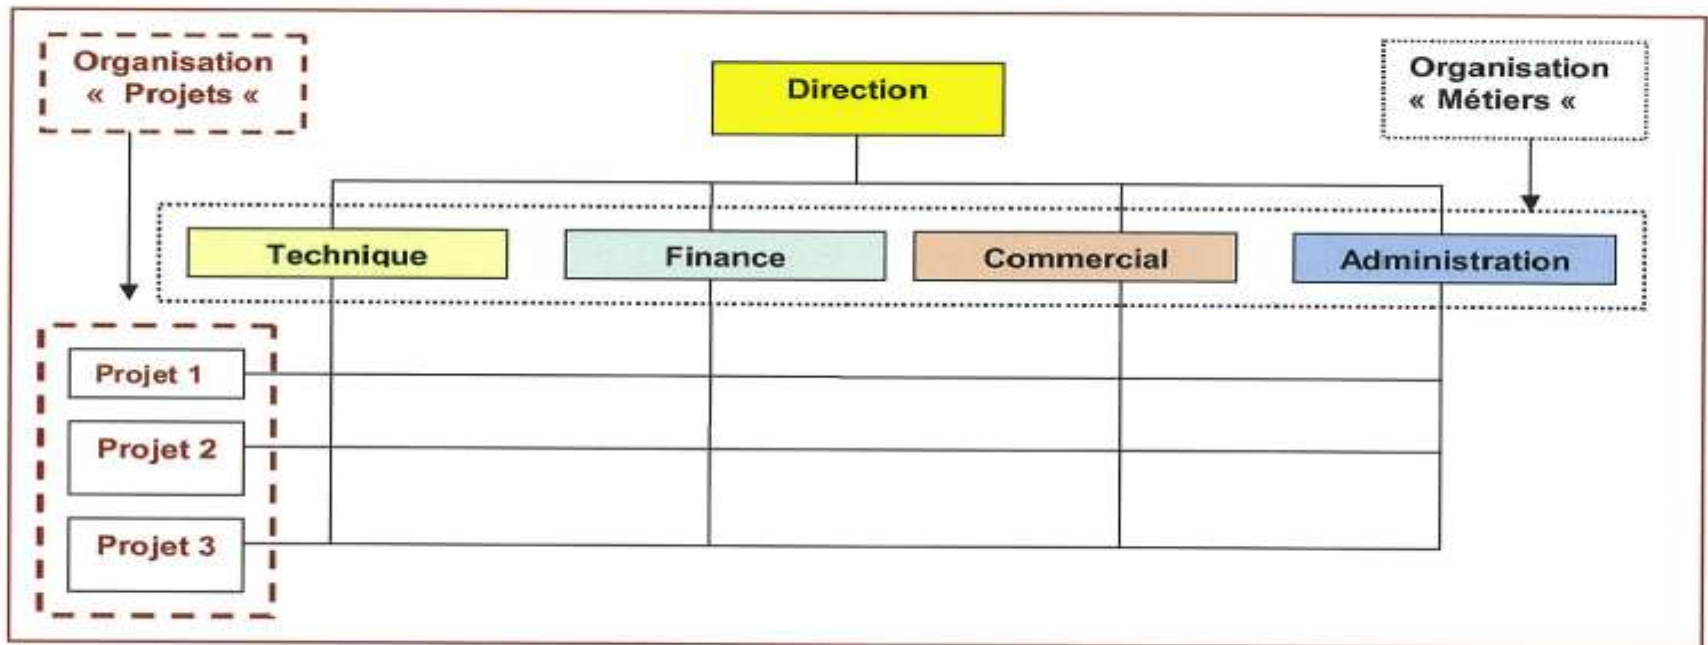

Une structure matricielle comprend la présence simultanée de composantes par projet et fonctionnelles.

Les composantes sont indépendantes du point de vue hiérarchique, mais interdépendantes pour la réalisation des projets

Typologie des structures organisationnelles

-La structure matricielle :

Suite

On parle aussi d'organisation croisée.

Sur la durée du projet, le chef de projet est responsable de l'utilisation des ressources pour son projet mais le personnel dépend hiérarchiquement de sa direction d'origine (l'axe métier). Le personnel peut être affecté à plusieurs projets en même temps en fonction de sa charge de travail.

Typologie des structures organisationnelles


- La structure matricielle :

Remarque : Un environnement matriciel est qualifié de **faible**, ou **fort** en fonction du degré d'autorité que possèdent les chefs de projet sur leur équipe

faible (gestionnaire fonctionnel détenant davantage d'autorité);

forte (gestionnaire de projet détenant davantage d'autorité).

Typologie des structures organisationnelles

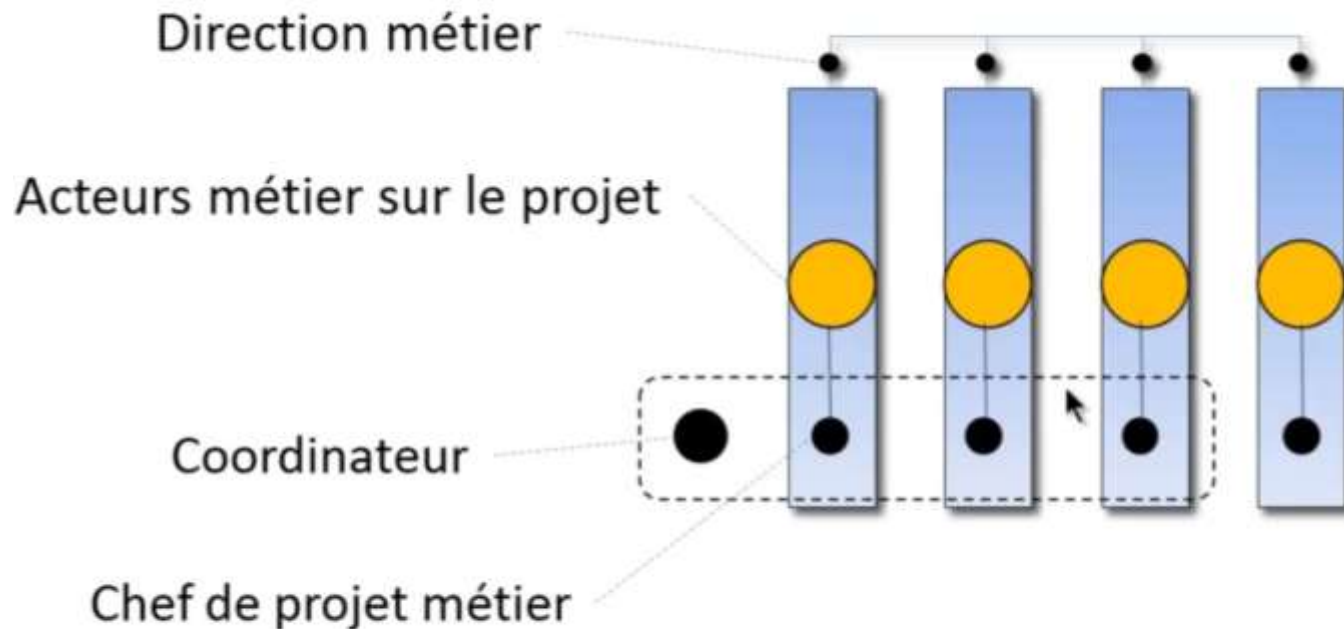

Structure « matricielle faible »


Typologie des structures organisationnelles

-La structure matricielle faible

Cette structure de projet est plus forte que la direction fonctionnelle. Donc on part toujours du même organigramme, mais on va désigner un coordinateur , ce coordinateur a des interlocuteurs à l'intérieur de chaque métier, on va alors parler d'une structure matricielle faible, cela veut dire que le chef de projet devra à la fois rendre des comptes à sa hiérarchie et au coordinateur . On va alors parler de coordination fonctionnelle horizontale et une coordination hiérarchique verticale . De la sorte on a un responsable de faire avancer le projet

Typologie des structures organisationnelles

-La structure matricielle faible (coordination de projet):

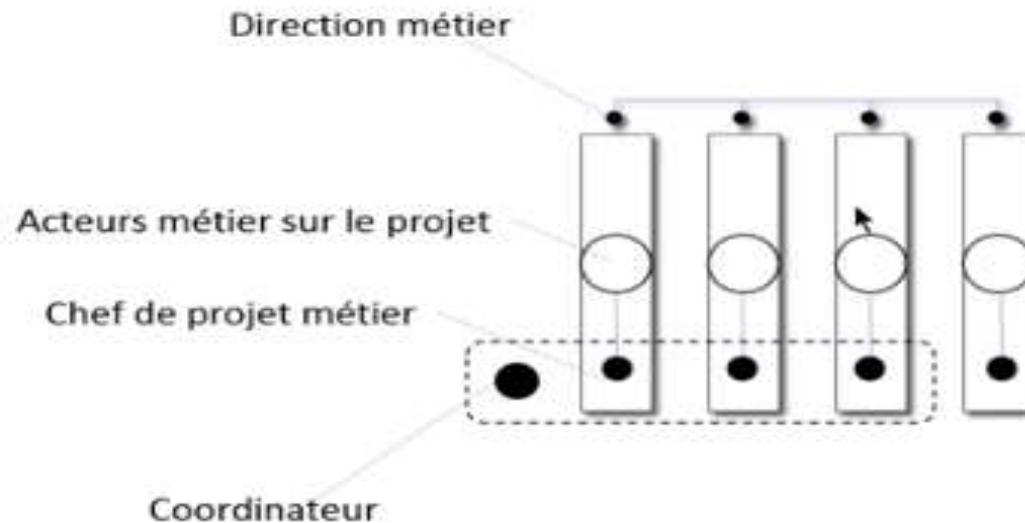

Structure « coordination de projet »

Typologie des structures organisationnelles

-La structure matricielle faible (coordination de projet) :

Dans une structure matricielle faible, on crée un système de coordination entre les services.

Le coordinateur : il a pour rôle de coordonner les missions des différents chef de projet métier. **Il a peu d'autorité mais il est présent.** Étant responsable du projet il peut le faire mieux avancer. **Les membres de l'équipe projet sont toutefois directement rattachés à leur hiérarchie, ils reçoivent la plupart de leurs ordres des directeurs fonctionnelles.**

Il y a une **coordination fonctionnelle** entre les chefs de projet métier et le coordinateur et une **coordination hiérarchique** entre les chefs de projet métier et la direction dont il dépend

le chef de projet a un faible pouvoir décisionnel. Son rôle est l'animation d'équipe

Typologie des structures organisationnelles

- La structure matricielle

Structure matricielle forte.

On donne beaucoup plus de poids au coordinateur qui devient directeur projet , Il peut interagir directement avec les acteurs-métier. Il a la même importance hiérarchique que le directeur métier.

le directeur de projet est un directeur de même rang que le directeur métier , il peut donner des directives aux acteurs métiers qui travaillent sur le projet .

Problème : Mais cela pose le problème managérial :un double commandement engendre que les acteurs-métiers sont tiraillés entre les ordres de leurs deux directeurs, qui ont des priorités différentes, donc il peut se trouver face à des ordres et des priorités contradictoires

Avantages : très adaptable, plus efficace, bonne optimisation des moyens.

Inconvénients : chacun a deux chefs (hiérarchique et fonctionnel). Parfois difficile à vivre d'autant plus si on travaille sur plusieurs projets en même temps.


Typologie des structures organisationnelles

- Structure matricielle forte ou Direction de projet

Inconvénient. En management il existe un principe qui est l'unité de commandement et qui dit que "pour bien fonctionner une personne doit avoir un et un seul chef". C'est qu'en fait l'acteur métier ici a simultanément deux chefs, deux chefs qui ont des priorités différentes, donc il peut se trouver face à des ordres et des priorités contradictoires. Donc on le voit le matriciel est plus souple, plus intéressant pour les projets, mais pose des problèmes d'organisation

Typologie des structures organisationnelles

- La structure matricielle forte

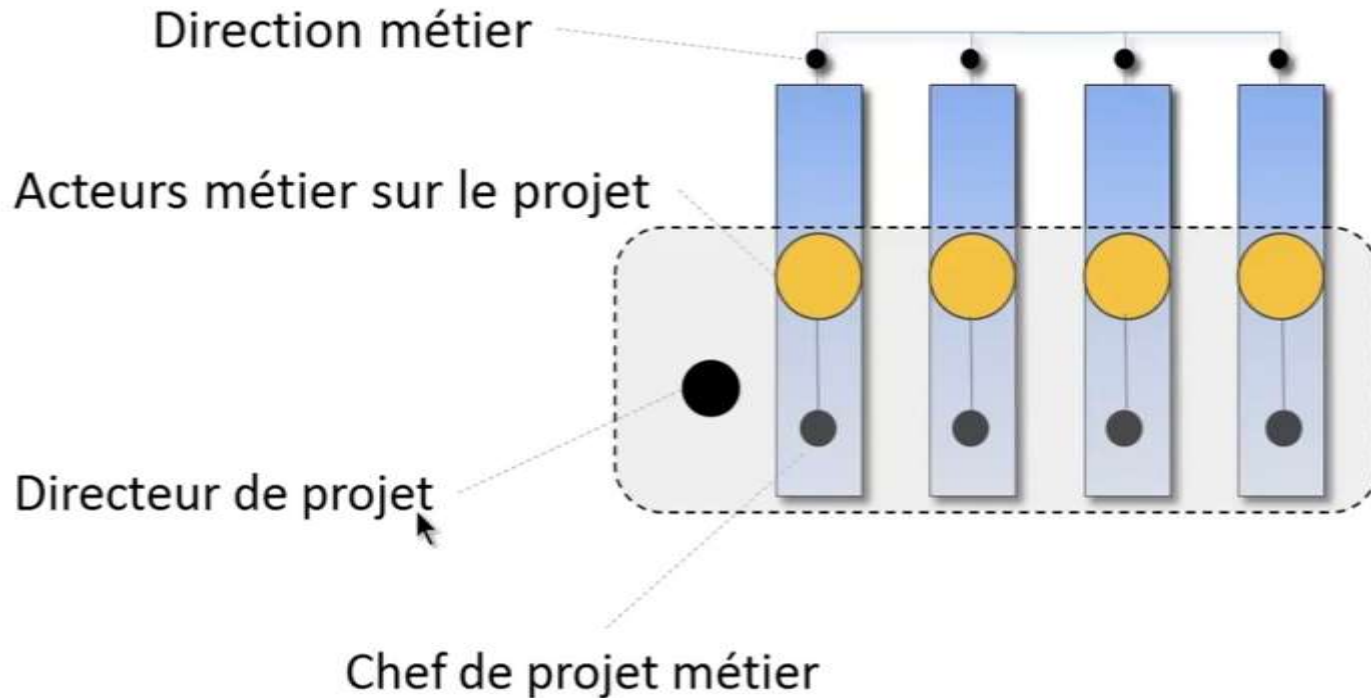

Structure « matricielle forte »


Typologie des structures organisationnelles

- Structure matricielle forte ou Direction de projet

- La figure suivante illustre les composantes de la structure matricielle forte. Cette structure se caractérise par son autonomie forte. Le chef de projet assure la direction du projet et il a une forte autorité sur l'équipe.

Typologie des structures organisationnelles

- La structure matricielle forte

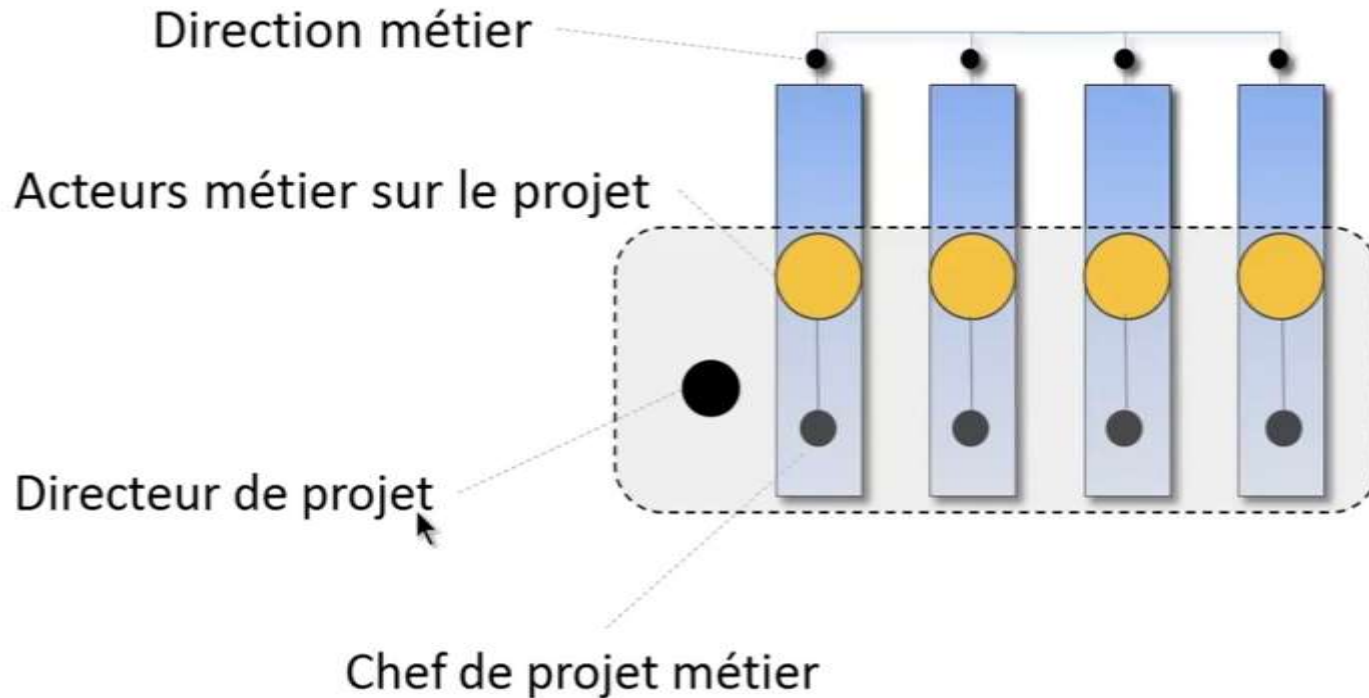

Structure « matricielle forte »

Typologie des structures organisationnelles


- La structure matricielle (suite):

Remarque importante

- Le mode de fonctionnement de type matriciel est actuellement répandu, car il répond aux objectifs suivants:
 - profiter d'un mode d'organisation par projet afin de mieux les réussir;
 - optimiser l'utilisation des ressources spécialisées en les partageant entre les projets en fonction des besoins;
 -

Typologie des structures organisationnelles

- La structure matricielle

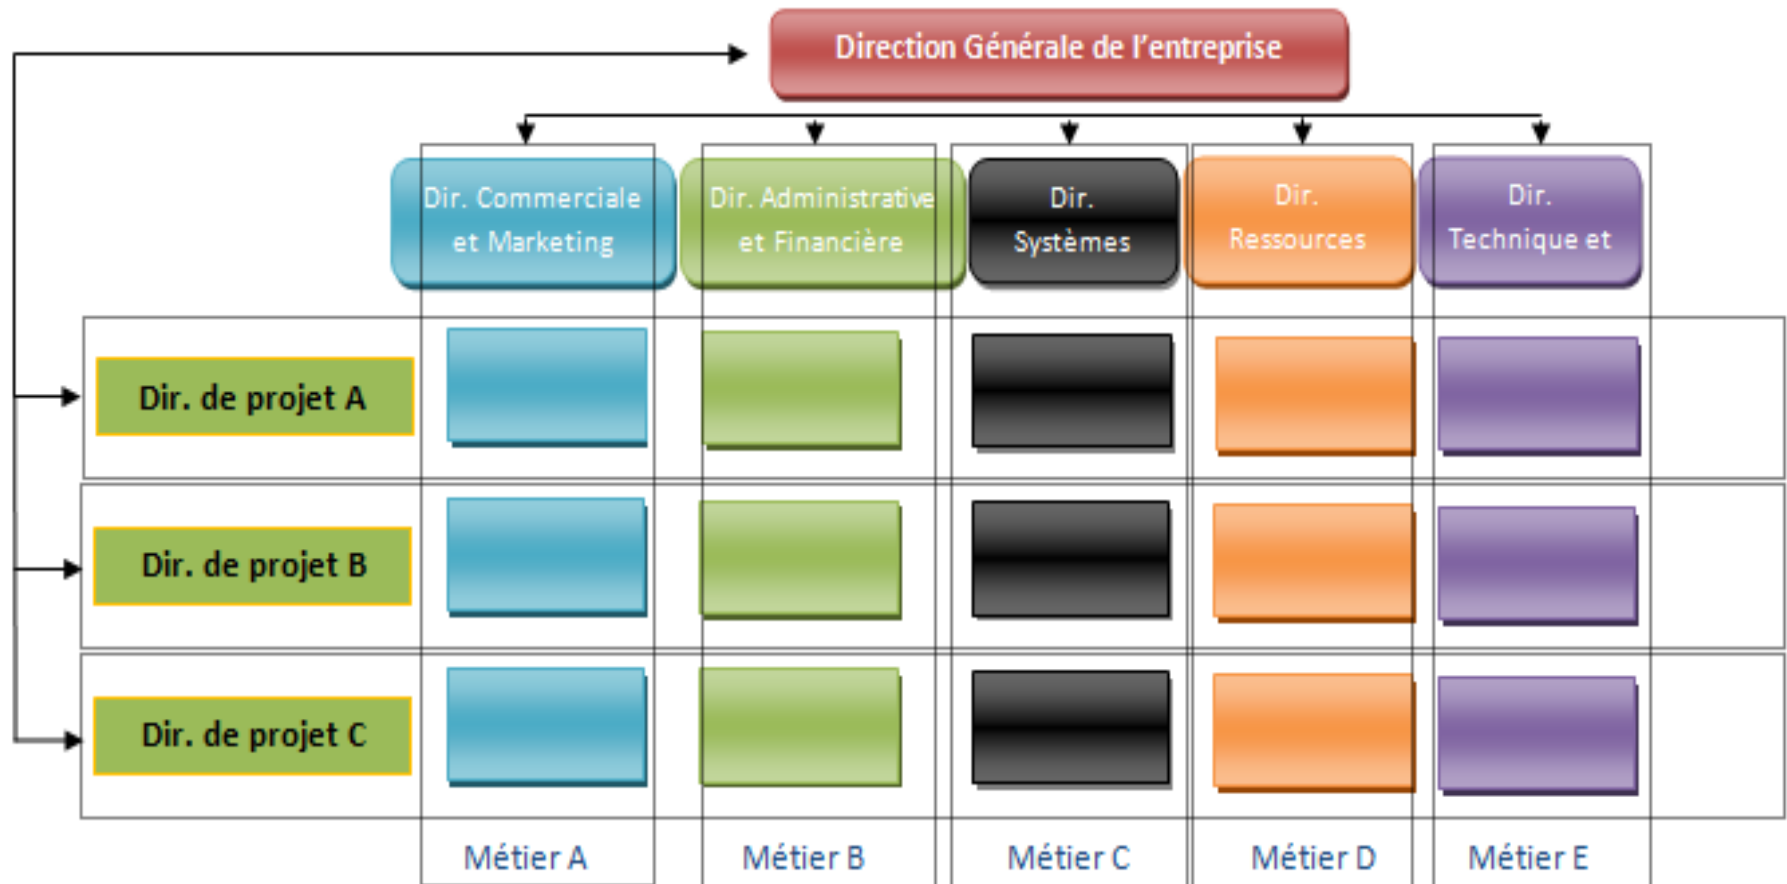

Typologie des structures organisationnelles

•Avantage et Inconvénients de la structure matricielle

Avantages :

- Le chef de projet est totalement focalisé sur son projet
- La formation d'équipes multidisciplinaire pour livrer de façon plus efficace les projets de l'organisation,
- offrir une grande réactivité aux changement de l'environnement,
- Motivation du groupe au projet
- Gestion efficace des ressources . الاستخدام الأمثل للموارد

Typologie des structures organisationnelles

•Avantage et Inconvénients de la structure matricielle

Inconvénients :

-**Chacun a deux chefs** (hiérarchique et fonctionnel). Parfois difficile à vivre d'autant plus si on travaille sur plusieurs projets en même temps.

Remarque : En management il existe un principe qui est l'unité de commandement et qui dit que "pour bien fonctionner une personne doit avoir un et un seul chef". (Fayol)

- **Les membres de l'équipe** ne connaissent pas forcément les styles et connaissances de leurs collègues

- **Les membres de l'équipe** se concentrent parfois sur leurs missions individuelles et moins sur le projet et ses objectifs

Typologie des structures organisationnelles

- La structure matricielle (suite):


- Cas d'utilisation

- Elle est utilisée dans les grandes entreprises pour des projets complexes
- Traitement de plusieurs projets en parallèle faisant appel aux mêmes compétences : développement de gammes de produits, industrie automobile, industrie pharmaceutique, etc.
- Projet dont l'enjeu est fondamental

Remarque : Cette structure a l'avantage de convenir à tout type de projet. Seuls ceux imposant des contraintes de délai extrêmement fortes peuvent en être exclus au profit d'un mode commando.

Le fonctionnement en équipe dédiée ou mode commando (Task force)

- Les personnes du projet sont sorties de leurs fonctions habituelles et travaillent à temps plein sur le projet. Dans ce cas on a un mode qui favorise une grande cohésion et l'avancement rapide du projet. C'est le mode d'organisation qu'on utilise en ingénierie simultanée, par exemple pour développer un nouveau véhicule.
- Avantage: équipe dédiée à 100% au projet
- Inconvénient: gestion des effectifs à la fin du projet

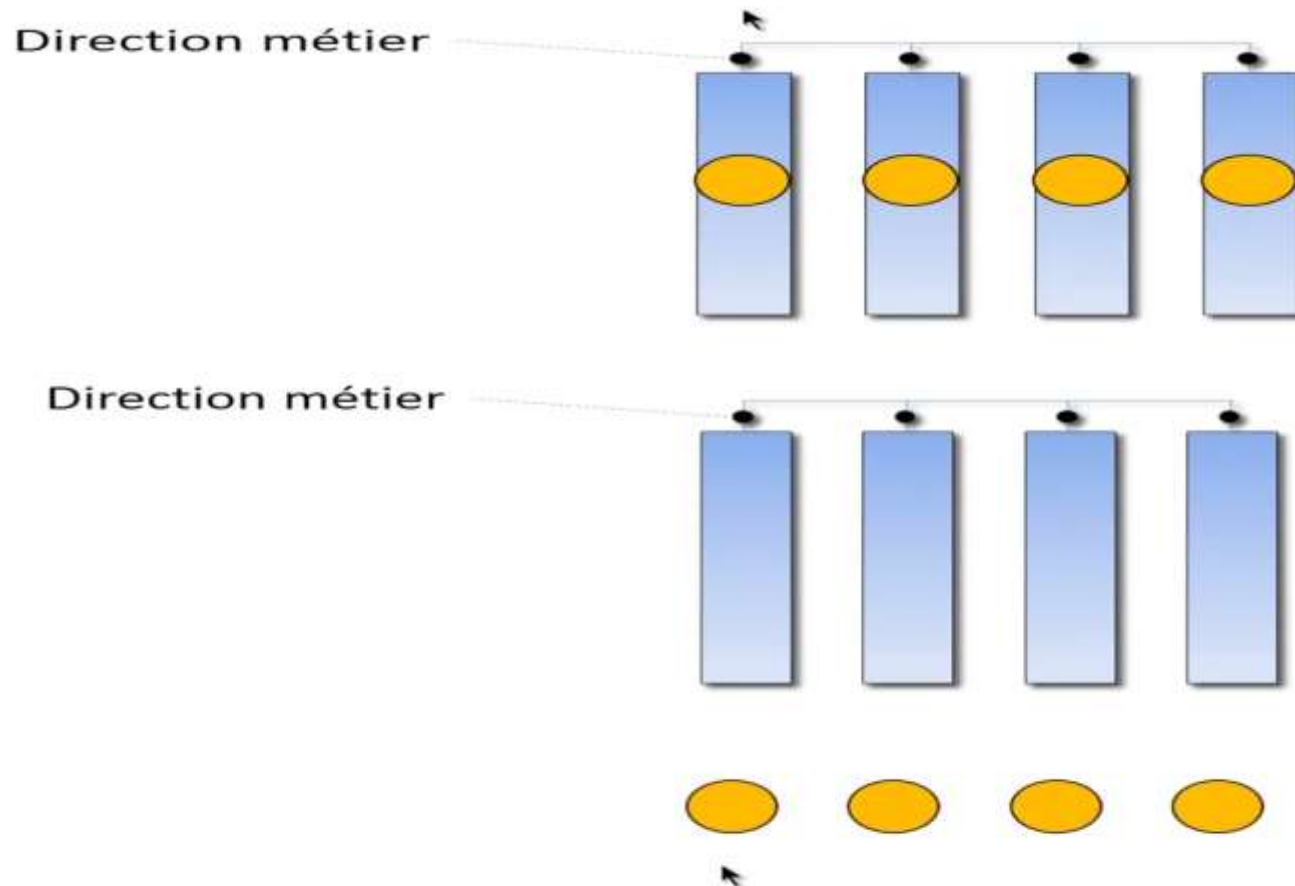

Structure « équipe dédiée », projet sorti

Le fonctionnement en équipe dédiée ou mode commando (Task force)

Le principe

Regrouper temporairement (quelques mois ou quelques années) les compétences de professionnels ayant des fonctions et des métiers différents autour de la réalisation d'un même projet sous la direction d'un responsable qui joue un rôle hiérarchique vis-à-vis d'équipiers "détachés".

Ce "commando " répond à un besoin ou une demande précise pour une mission ponctuelle bien identifiée avec des objectifs clairs.

Le modèle équipe dédiée ou Task Force demande la mise en oeuvre de moyens importants et concerne les projets stratégiques ou « très en retard ».

Ce type d'organisation est utilisé parfois de manière ponctuelle quand la variable « inconnue » est fortement présente. Cette force opérationnelle (« task force »), organisation temporaire née de la marine Américaine, se prête particulièrement bien aux projets issus d'une problématique soudaine, dont l'importance, le niveau de complexité et le degré d'urgence nécessite la mobilisation d'une équipe d'experts.

Le fonctionnement en équipe dédiée ou mode commando (Task force)

Description


Le chef de projet a la responsabilité complète du projet qui devient alors une structure indépendante. Chaque membre de l'équipe est affecté à plein temps au projet et détaché de sa direction d'origine pour la durée du projet.



Cas d'utilisation

- ✓ Projet important
- ✓ Grande complexité
- Utilisation des ressources à temps plein

Typologie des structures organisationnelles

Équipe dédiée **ou mode commando** (Task force)

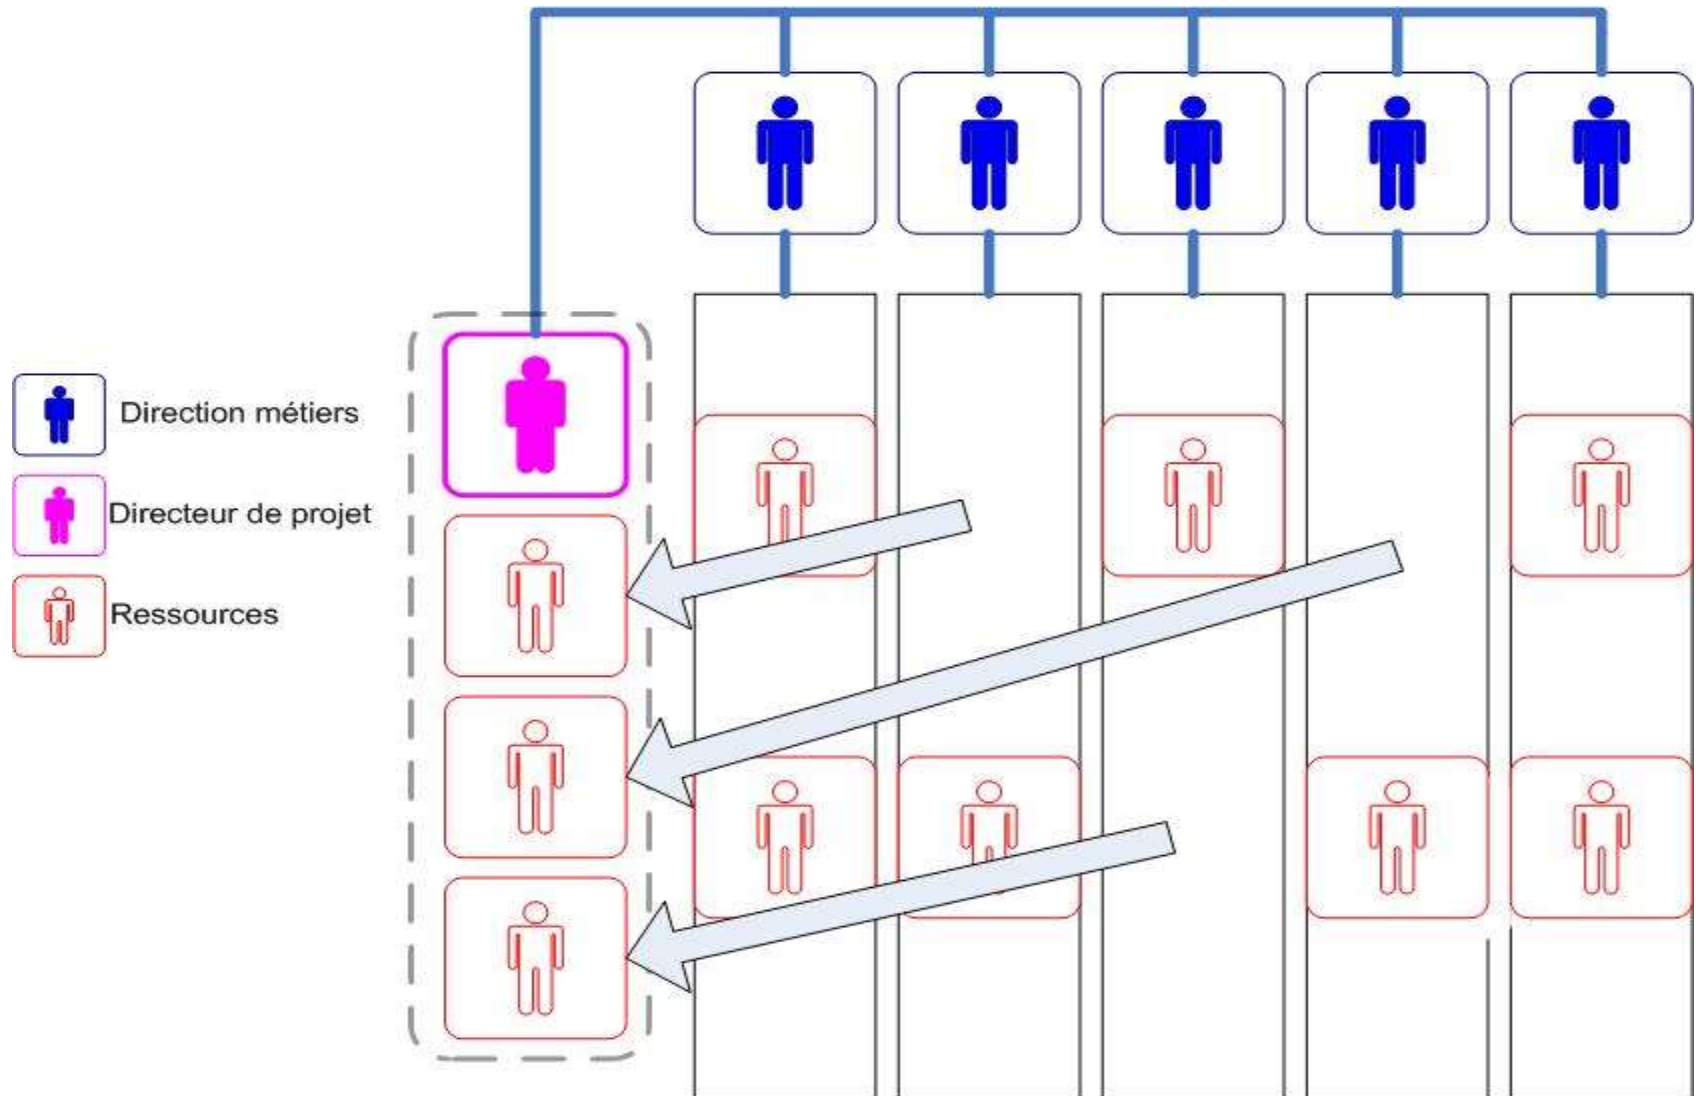

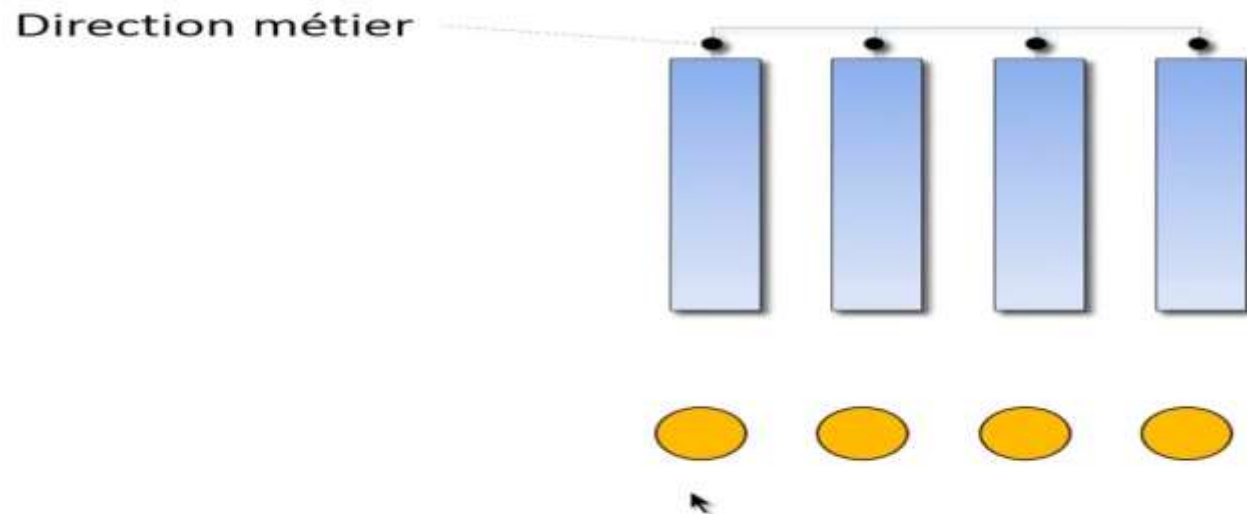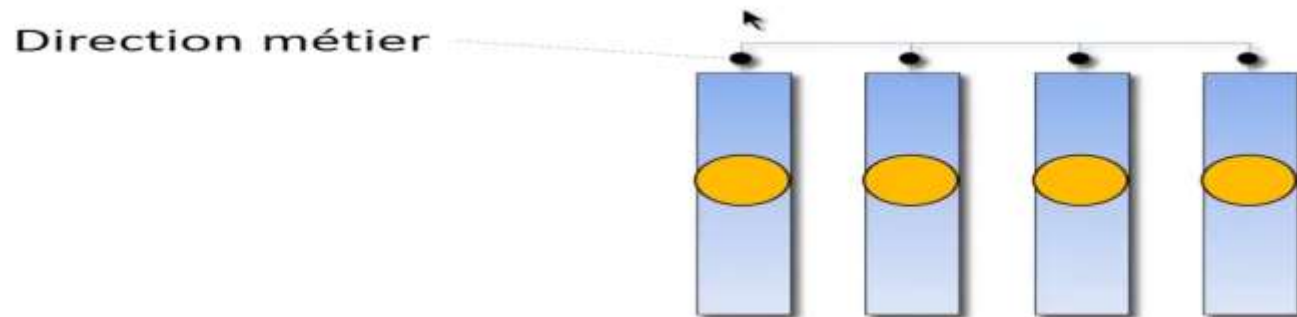


Structure « équipe dédiée », projet sorti

Le fonctionnement en équipe dédiée ou mode commando (Task force)


- Un plateau projet est créé
- Le directeur projet a une structure propre
- Des membres des services des directions métiers sont affectés aux projets

Équipe dédiée ou mode commando (Task force)

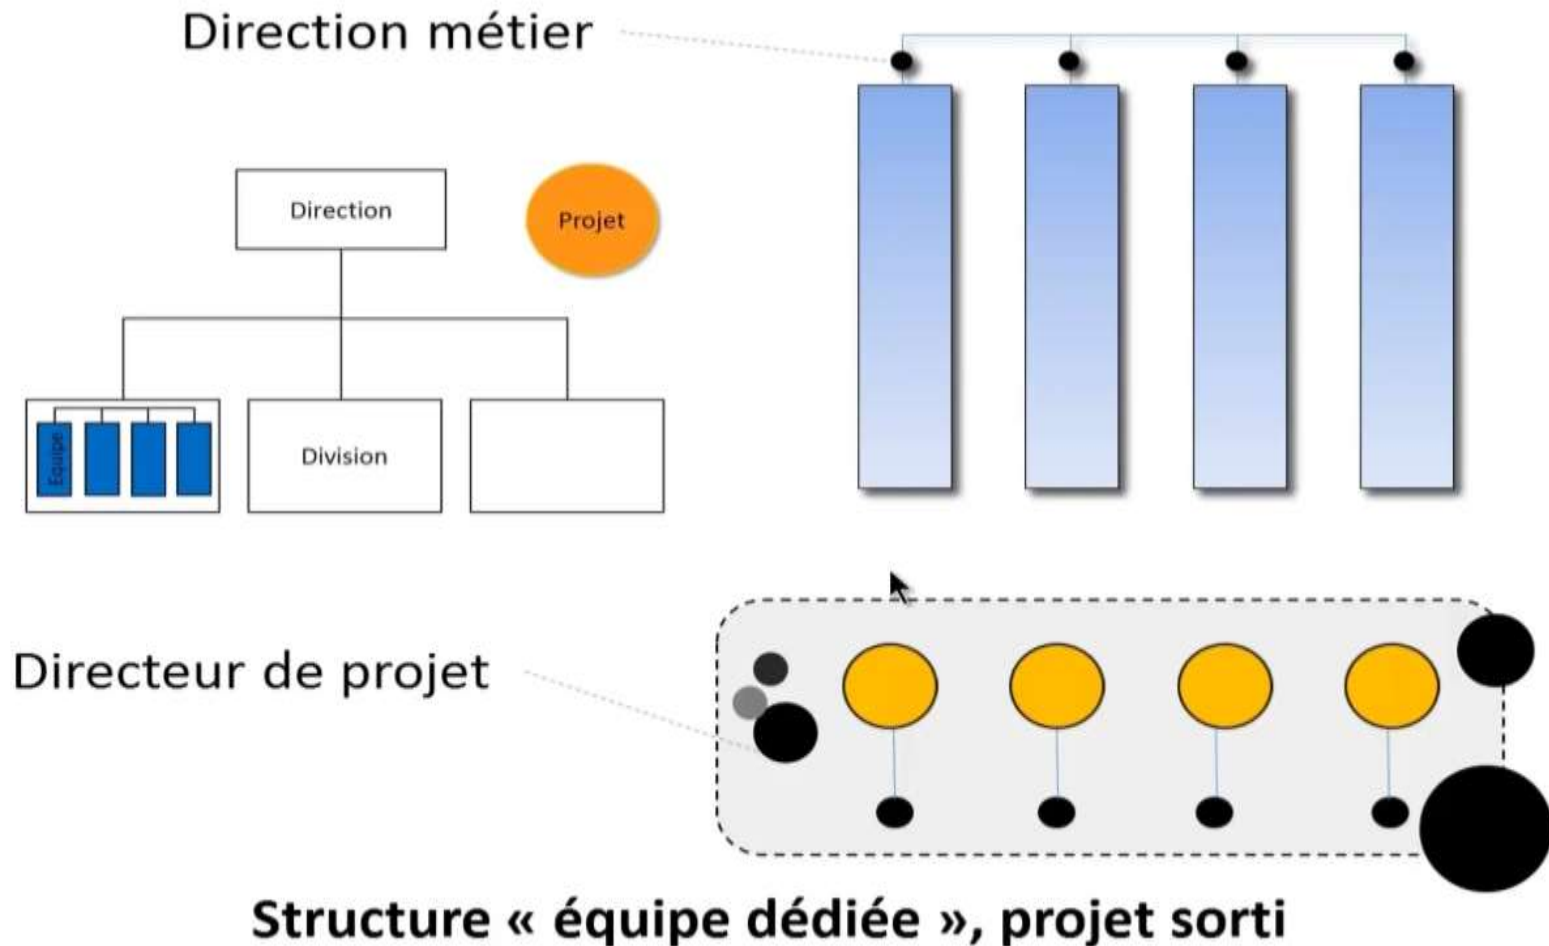

Typologie des structures organisationnelles

Équipe dédiée ou mode commando (Task force)

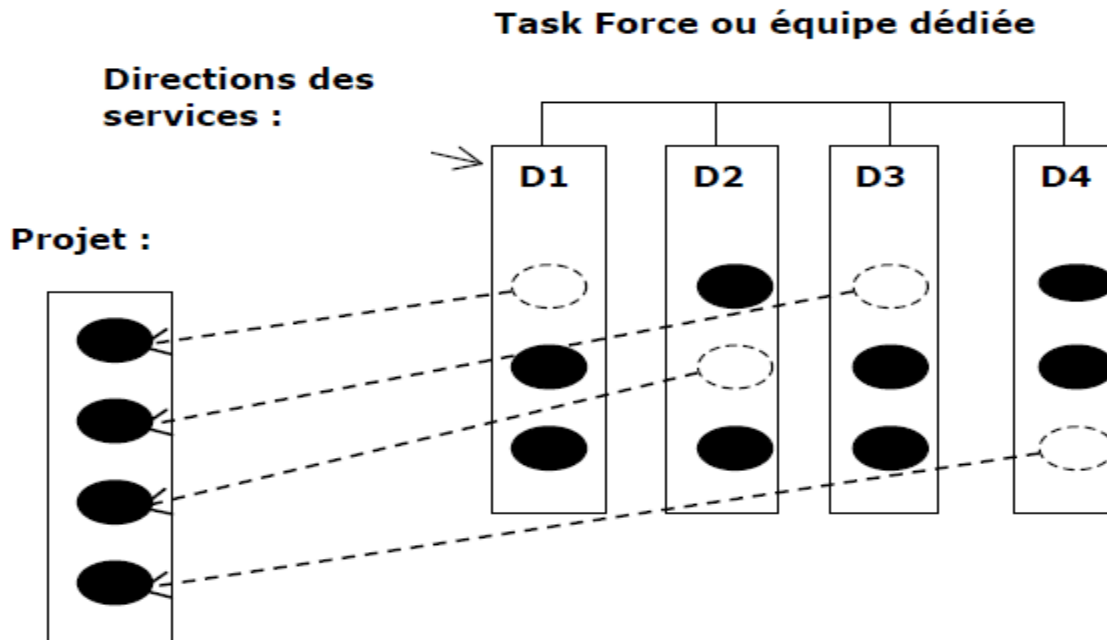

Les principaux acteurs d'un projet

Maître d'oeuvre et Maître d'ouvrage

L'oeuvre désigne le processus du projet et l'ouvrage désigne le résultat de ce processus

le maître d'oeuvre est la personne (physique ou morale) chargée de réaliser l'ouvrage.

Le maître d'ouvrage c'est lui qui décide de réaliser le projet, c'est lui qui le finance et au bout du compte il sera le propriétaire du résultat (de l'ouvrage)

Maître d'oeuvre et Maître d'ouvrage

Exemple simple

Si vous décidez de **faire construire votre future maison** vous êtes en position de **maître d'ouvrage**.

L'entreprise à qui vous délèguerez la responsabilité de mettre en "oeuvre" votre projet est en position de **maîtrise d'oeuvre**

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre



Maître d'ouvrage	Expression initialement confinée aux projets de construction.
Propriétaire (du projet)	Expression utilisée même pour des projets internes
Client	Expression aussi bien utilisée pour des projets internes qu'en gestion d'affaires
Porteur de projet	Expression très connotée création d'entreprise
Commanditaire	Expression très générale

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre

- Remarque
- La MOA décrit le besoin dans le cahier des charges fonctionnel.
- La maîtrise d'oeuvre (MOE) prend connaissance du besoin exprimé par la MOA pour y **apporter une réponse technique**. Pour ce faire, elle rédige un dossier de réponse au besoin, parfois nommé « cahier des charges technique », « dossier de paramétrage », « **dossier de conception générale** / détaillée » ou encore « **étude technique** ».

La constitution de l'équipe projet

- Définition

- ❖ Ensemble des personnes chargées de la réalisation du produit du projet.

- Rôles

- Réalise les travaux

- Rend compte de leur avancement au chef de projet

La constitution de l'équipe projet

- L'équipe projet
 - Elle est choisie par le chef de projet.
 - Elle comprend les personnes prenant une part active dans la réalisation du projet, les responsables de lots de travaux ou de tâches
 - Elle regroupe des acteurs et des compétences diverses.
 - Elle doit être limitée en taille (une dizaine de personnes par exemple).
 - Les personnes peuvent être internes au MOE ou externes : experts et sous traitants

La constitution de l'équipe projet

Rôle du chef de projet

Le chef de projet est la personne chargée de mener un projet et de gérer son bon déroulement. Il a la charge d'animer et coordonner les travaux de l'équipe projet.

- **Concepteur**: développer un plan de travail.
- **Pilote** : conduire le projet sous les aspects de performance, coûts et délai (Contrôleur: surveiller si le planning est respecté).

Capitaliser les expériences acquises الاستفادة من الخبرات المكتسبة pour procéder aux retours d'expérience nécessaires en vue de futurs projets

- **Orateur**: présider des réunions et faire des présentations.
- **Coach**: motiver les gens et les conseiller.
- **Expert**: connaître la branche du projet sur le bout des doigts.
- **Gestionnaire de risques**: surveiller les risques et réfléchir à des alternatives si les choses ne se déroulent pas comme prévu (D'attirer l'attention sur les risques à venir : technique, calendaires et de coûts) .

La constitution de l'équipe projet

Qualité des hommes de projet

1. **La communication** :
 - savoir s'exprimer et fonctionner dans un groupe
2. **La capacité d'analyse** :
 - savoir trouver le problème, faire un diagnostic
 - Savoir le prouver (étude de marché, enquêtes, prototypes, simulation)
3. **L'esprit de synthèse** :
 - Savoir faire des recommandations pertinentes et réalistes pour les décideurs
4. **La capacité de fonctionnement** en univers incertains, changeant empreint de risque et avec des équipes transitoires

Les parties prenantes d'un projet

Qu'est qu'une partie prenante?

- Ce sont **des personnes ou des organisations** qui ont des attentes ou des interactions sur le projet et dont les intérêts peuvent être **affectés positivement ou négativement** par la performance du projet ou par son achèvement. »
- Elles peuvent être **internes comme externes** à la structure du projet, ce sont les équipiers, les responsables de ressources, des associations de consommateurs, ou des fournisseurs ...
- D'une façon générale c'est **toute personne qui impacte ou qui est impacté par le projet**

Remarque : La réussite d'un projet c'est la satisfaction de ses parties prenantes

Les parties prenantes d'un projet

Remarque :

la participation de ces intervenants aux différentes phases du projet doit être organisée afin :

- ✓ d'utiliser au mieux les compétences de chacun
- ✓ d'éviter toute perte d'énergies et
- ✓ de minimiser les facteurs de risques

□. أصحاب المصلحة.



■ أصحاب المصلحة

■ Stakeholders

- هم الأفراد المضطلعين بأدوار فاعلة في المشروع و أولئك الذين يحتمل تأثر مصالحهم
- كنتيجة لتنفيذ المشروع أو إستكمال المشروع

- Are Involved in or affected by project activities



- مدير المشروع
- فريق العمل
- الضامن
- فريق دعم من داخل المنشأة
- مستخدمون
- المقاومون أو المعارضون للمشروع

Les parties prenantes d'un projet

« les pp peuvent avoir une **influence positive ou négative** sur un projet »

Les pp **positives** sont celles qui devraient normalement bénéficier de **la réussite du projet**, tandis que les pp **négatives** sont celles qui considèrent que le succès du projet auraient pour elles des **conséquences négatives**

Les parties prenantes d'un projet

En interne

- **Le commanditaire** (ou demandeur, ou encore client interne) : c'est le premier concerné par le projet . **Il s'agit de la personne ou de l'organisation qui finance le projet.** C'est donc à lui que revient la prise de décisions importantes. **Le contenu et le niveau de qualité du projet ainsi que l'échéancier et le budget sont définis par le commanditaire..**
- **L'équipe projet** : comprenant le chef de projet ainsi que les autres membres de l'équipe . L'équipe projet est choisie par le chef de projet. C'est elle qui est **chargée de la réalisation du projet.** *Chaque membre est sélectionné pour ses compétences et se voit attribuer un nombre de tâches qu'il doit accomplir en respectant les échéances et le budget, ainsi que la qualité exigée.*

Les parties prenantes d'un projet

En interne

- **Les services supports impliqués** : la comptabilité, la logistique (Transport, stockage, emballage التغليف) les ressources humaines, l'informatique... **qui apportent leur support dans le cadre des travaux d'analyse et de conception de solutions.**
- **Les autres experts** : **apportant leurs conseils** ponctuellement (directeurs fonctionnels...)
- **Le management de l'entreprise** : Le management de l'entreprise doit soutenir le chef de projet et son équipe, notamment en mobilisant les autres services de l'entreprise, mais aussi en facilitant la prise de décision, en fournissant un cadre de travail agréable aux employés, en offrant une rémunération attractive, des horaires flexibles et des conditions de travail favorables, etc.

Les parties prenantes d'un projet

En externe

- **Les clients** : les premiers concernés en externe,. **Il s'agit des personnes qui achètent le projet.** Il peut s'agir d'un client externe ou de l'entreprise elle-même. Dans certains cas, le client est aussi le commanditaire du projet. C'est une partie prenante très importante.
- **Les fournisseurs** : de matière, de prestation, de main d' œuvre. Les fournisseurs
- Les fournisseurs doivent fournir l'équipement, le matériel ou les logiciels nécessaires à la réalisation du projet. Ils peuvent aussi être des sous-traitants qui travaillent sous la direction du chef de projet. S'ils livrent le matériel en retard, cela aura des répercussions sur l'échéancier et le budget du projet. Il s'agit d'une partie prenante clé dans la réussite du projet. **Mal choisir ses fournisseurs peut mettre en échec votre projet.**
- **les organismes publics** : dans le cas où votre projet doit s'inscrire dans un cadre juridique précis

Les parties prenantes d'un projet

En externe

- **les organismes publics** **السلطات العامة**: dans le cas où votre projet doit s'inscrire dans un cadre juridique **précis**
- **Les pouvoirs publics**
- Il s'agit des autorités qui dirigent l'administration générale de l'Etat et font appliquer les lois sur le territoire nationale.
Exemple : **pour la construction d'une nouvelle usine ou d'un pont, vous devez consulter les pouvoirs publics afin d'obtenir les autorisations nécessaires et connaître les différentes contraintes.** Il s'agit d'une partie prenante très importante car si **vous n'obtenez pas les autorisations obligatoires ou si votre projet ne respecte pas les normes imposées, il peut tout simplement être annulé.**

Les parties prenantes d'un projet

Les acteurs habituels d'un projet informatique sont :

- Le chef de projet
- Le responsable qualité
- L'administrateur de données
- Un ou des consultant(s)
- Un (ou des) experts
- Une équipe d'organiseurs
- Une équipe d'analystes informatiques
- une équipe d'analystes programmeurs
- Des exploitants informatiques
- Des représentants de la maîtrise d'ouvrage : directeurs, spécialistes métiers, experts juridiques ou réglementaires,....

Les parties prenantes d'un projet

Conclusion

- L'impact des parties prenantes peut être décisif sur la progression et la réussite d'un projet. Il est donc essentiel que le chef de projet et son équipe identifient précisément qui sont les parties prenantes dès le démarrage du projet. Il faut ensuite définir leur rôle et leurs attentes vis-à-vis du projet.
- *Les parties prenantes qui ignorent leurs responsabilités peuvent porter préjudice aux objectifs du projet, de la même manière les chefs de projet qui ignorent les parties prenantes peuvent s'attendre à un impact néfaste sur les résultats du projet.*
- - Il est indispensable en phase initiale d'un projet de procéder à une analyse des interactions avec les pp (surtout négatifs) et d'anticiper les réactions possibles, puis développer des stratégies ou tactiques de riposte ou de renforcement
- Ne négligez aucune des parties prenantes afin de garantir le succès de votre projet.
